
Vergaderjaar 2025–2026

36 945 K

**Jaarverslag en Slotwet
Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) 2025**

Nr. 1


JAARVERSLAG VAN HET DEFENSIEMATERIEELBEGROTINGSFONDS
Ontvangen 20 mei 2026

INHOUDSOPGAVE


Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten	3
A. Algemeen	4
1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening	4
Dechargeverlening door de Tweede Kamer	6
Dechargeverlening door de Eerste Kamer	6
2. Leeswijzer	7
B. Beleidsverslag	9
3.1 Defensiematerieelverslag	9
3.2 Onderuitputting	15
4. Beleidsartikelen	17
4.1 Artikel 1 Defensiebreed materieel	17
4.2 Artikel 2 Maritiem materieel	23
4.3 Artikel 3 Land materieel	27
4.4 Artikel 4 Lucht materieel	31
4.5 Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed	35
4.6 Artikel 6 IT	40
4.8 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten	43
5. Bedrijfsvoeringsparagraaf	44
C. Jaarrekening	46
6. Verantwoordingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds	46
7. Saldibalans	47
D. Bijlagen	53
Bijlage 1 Lijst met afkortingen	53

GEREALISEERDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 10.169,3

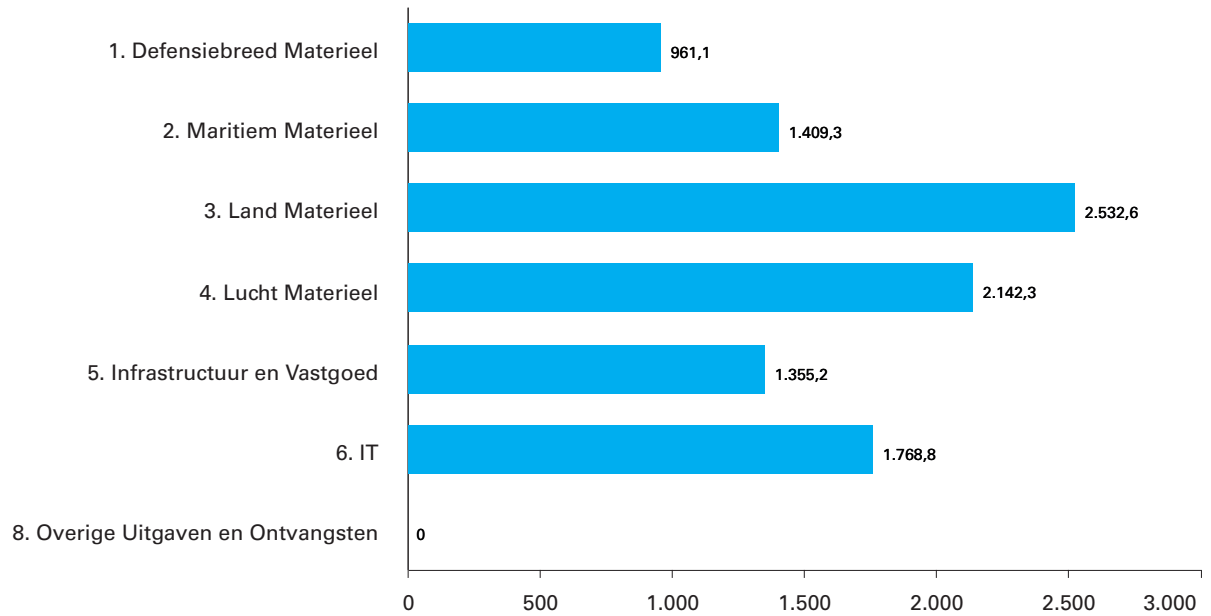

Figuur 2 Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 212,8

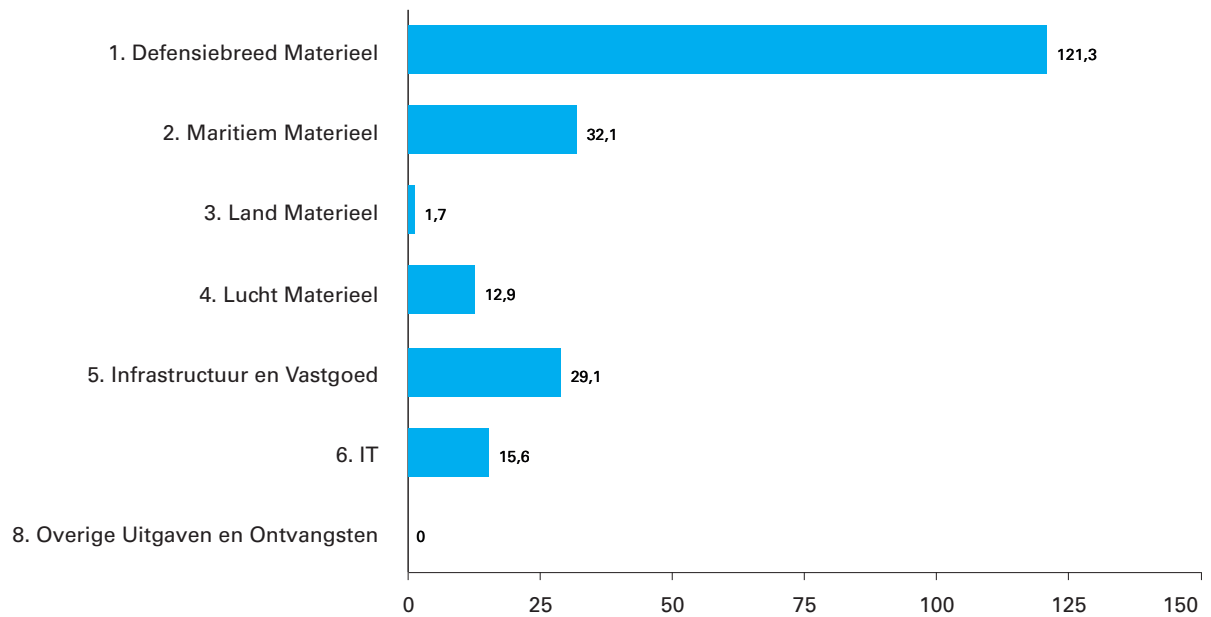

A. ALGEMEEN

1 1. Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening

AAN de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Hierbij bied ik, mede namens de staatssecretaris van Defensie, het jaarverslag met betrekking tot de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) over het jaar 2025 aan.

Onder verwijzing naar de artikelen 2.37 en 2.40 van de Comptabiliteitswet (CW) 2016 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Defensie decharge te verlenen over het in het jaar 2025 gevoerde financiële beheer.

Voor de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening stelt de Algemene Rekenkamer (AR) als externe controleur op grond van artikel 7.14 van de Comptabiliteitswet 2016 een rapport op. Dit rapport wordt op grond van artikel 7.15 van de Comptabiliteitswet 2016 door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Algemene Rekenkamer over:

- a. het gevoerde begrotingsbeheer, financieel beheer, materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties van het Rijk;
- b. de centrale administratie van de schatkist van het Rijk van het Ministerie van Financiën;
- c. de financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen;
- d. de totstandkoming van de niet-financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen;
- e. de financiële verantwoordingsinformatie in het Financieel jaarverslag van het Rijk.

Bij het besluit tot dechargeverlening worden verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken betrokken:

- a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2025
- b. het voorstel van de slotwet dat met het onderhavige jaarverslag samenhangt;
- c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het onderzoek van de centrale administratie van de schatkist van het Rijk en van het Financieel jaarverslag van het Rijk;
- d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer over de in het Financieel jaarverslag van het Rijk, over 2025 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten over 2025 alsmede over de saldibalans over 2025 de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 7.14, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.

De Minister van Defensie,

D. Yeşilgöz-Zegerius

Dechargeverlening door de Tweede Kamer

Onder verwijzing naar [artikel 2.40](#) van de Comptabiliteitswet 2016 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Tweede Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van [artikel 2.40](#), derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.

Dechargeverlening door de Eerste Kamer

Onder verwijzing naar [artikel 2.40](#) van de Comptabiliteitswet 2016 verklaart de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van

De Voorzitter van de Eerste Kamer,

Handtekening:

Datum:

Op grond van [artikel 2.40](#) van de Comptabiliteitswet 2016 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën.

2. Leeswijzer

Algemeen

Voor u ligt het jaarverslag van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF), hoofdstuk K van de Rijksbegroting. Naast het DMF kent Defensie ook een reguliere begroting (hoofdstuk X). Voor beide begrotingen zijn separate jaarverslagen opgesteld.

Het DMF zorgt voor de financiering en bekostiging van investeringen en instandhouding van het materieel, de infrastructuur en de IT-middelen van Defensie. Door een apart fonds voor het defensiematerieel wordt invulling gegeven aan een meerjarig integraal beheer van de financiering en bekostiging van het materieel, de IT-middelen en de infrastructuur van het Ministerie van Defensie.

Verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie worden conform de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) volgens onderstaande staffelgrenzen toegelicht. Dit zijn dezelfde staffelgrenzen die worden toegepast voor het toelichten van mutaties in de suppletoire begrotingen.

Tabel 1 Staffelgrenzen voor het toelichten van mutaties

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 en < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Vanwege het commercieel vertrouwelijke karakter van enkele projecten worden in enkele gevallen geen gedetailleerde toelichtingen en bedragen genoemd.

Opzet DMF

In het jaarverslag 2025 wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten ten opzichte van de begroting van het DMF 2025. De structuur van het jaarverslag is als volgt:

- Deel A: Algemeen. In dit deel wordt het jaarverslag officieel aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden met het verzoek tot dechargeverlening. Daarnaast maakt deze leeswijzer onderdeel uit van het algemene deel.
- Deel B: Het Beleidsverslag. De kern van het jaarverslag wordt gevormd door het beleidsverslag. Dit beleidsverslag bestaat uit drie delen:
 1. Het Defensiematerieelverslag, waar onder andere een korte terugblik is opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten over het jaar 2025;
 2. De artikelen van het DMF;
 3. De bedrijfsvoeringsparagraaf.
- Deel C: De Jaarrekening, bestaande uit de verantwoordingsstaat en de saldibalans van het DMF.

In het jaarverslag van het DMF worden de met Prinsjesdag 2024 bestaande DMP-plichtige investeringsprojecten opgenomen. Het projectbudget bestaat uit de onderzoekskosten, de basisraming en de risicoreservering. Deze werkwijze komt overeen met het Defensie Projectenoverzicht

(DPO). Het DPO wordt jaarlijks aan de Tweede Kamer aangeboden. Het DPO geeft een overzicht van alle materieel- en wapensysteemgebonden IT-projecten van meer dan € 50,0 miljoen in onderzoek en realisatie. Projecten die door de Tweede Kamer als groot project zijn aangemerkt en die volgens hun uitgangspuntennotitie een separate rapportage kennen, worden niet opgenomen in het DPO.

In het DMF worden de verschillende fasen van verwerving inzichtelijk gemaakt. In het jaarverslag worden vanwege het commercieel vertrouwelijke karakter van de projecten in de voorbereidings- en de onderzoeksfase de bedragen van de mutaties niet genoemd. Tevens vindt er op de budgetten in voorbereidings- en onderzoeksfase geen uitgaven plaats. Het budget wordt doorgeschoven naar latere jaren indien de voorbereiding en/of het onderzoek in 2025 nog niet is afgerond. Indien gestart kan worden met verwerving, wordt het projectbudget overgeheveld naar de realisatiefase. In dit jaarverslag wordt daarom op de voorbereidings- en onderzoeksfase niet, en op de realisatiefase wel gerealiseerd.

Voor projecten in de realisatiefase betekent dat de opdracht voor verwerving is gegeven aan de uitvoeringsorganisatie. Zij starten de verweringsvoorbereidingsfase (D-fase). Voor grote materieel en IT-projecten is dat het Commando Materieel en IT (COMMIT) en voor grote Vastgoed en Infra projecten gaat dit om het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Deze systematiek wijkt in de kern niet af van de werkwijze die voorgaand in de Defensiebegroting werd gehanteerd; in het DMF zijn weliswaar de toelichtingen uitgebreider.

Grondslagen voor de vastlegging en de waardering

De verslaggevingsregels en waarderingsgrondslagen die van toepassing zijn op de in dit jaarverslag opgenomen financiële overzichten zijn ontleend aan de [Comptabiliteitswet 2016](#) en de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2026 en de Regeling agentschappen. Voor de departementale begrotingsadministratie wordt het verplichtingen-kasstelsel toegepast en voor de baten-lasten agentschappen het baten-lastenstelsel.

Groei-paragraaf

In het jaarverslag 2025 zijn ten opzichte van het jaarverslag 2024 een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor de toelichtingen en tabellen in de artikelen beter aansluiten bij het DPO. Deze aanpassingen hangen samen met de aanpassingen in de ontwerpbegroting 2025 ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024.

Daarnaast zijn met de ontwerpbegroting 2025 ook een aantal aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd om de structuur beter aan te laten sluiten op de RBV. Omdat dit jaarverslag terugblik op de ontwerpbegroting 2025 zijn deze aanpassingen ook in de structuur van het jaarverslag 2025 doorgevoerd.

B. BELEIDSVERSLAG

3.1 Defensiematerieelverslag

Inleiding

Vanwege de verslechterde internationale veiligheidssituatie is het belang van een krachtige en toekomstbestendige krijgsmacht sinds decennia niet zo groot geweest. De geopolitieke situatie leidt tot een urgente en structurele behoefte aan meer militairen, meer capaciteiten en meer ruimte. Om invulling te geven aan de benodigde bondgenootschappelijke capaciteiten heeft Defensie in 2025 de nodige stappen gezet om te beschikken over hoogwaardig materieel, IT en fysieke infrastructuur. De Russische agressie-oorlog in Oekraïne heeft geleid tot verdere versterkte samenwerking binnen de NAVO en de EU waarbij veel landen hun defensie-uitgaven hebben verhoogd. Met de Voorjaarsnota 2025 heeft kabinet Schoof besloten tot een verhoging van de defensie-uitgaven van structureel € 737 miljoen.

We hebben de ambitie om de inzetbaarheid en gereedheid van de krijgsmacht te verhogen, de gevechtskracht gericht te verbeteren en wendbaarder te zijn. Met het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) is Defensie beter in staat tot een meerjarig integraal beheer van de financiering en bekostiging van de ontwikkeling, verwerving, instandhouding en afstoting van materieel, IT-middelen en infrastructuur en vastgoed. Het DMF maakt dit inzichtelijk door per beleidsartikel de projecten in voorbereiding, onderzoek en realisatie toe te lichten. Het uiteindelijke doel is door middel van het DMF te komen tot een meer schokbestendige investeringsbegroting, terwijl de Tweede Kamer goed in staat blijft haar controlerende taak uit te voeren.

Wendbaarheid en actualisatie Defensie Materieelproces

Voor de versterking van de krijgsmacht is de tijdige beschikking over het benodigde materieel essentieel. Dit vraagt om een wendbare defensieorganisatie die haar interne processen stroomlijnt. Na de actualisatie van het Defensie Materieelproces (DMP) (Kamerstuk [27 830, nr. 431](#)) kan Defensie beter inspelen op veranderende behoeften en sneller en effectiever handelen in een markt waarin de vraag naar materieel en wapensysteemgebonden IT nog steeds toeneemt.

Op 23 april 2025 heeft uw Kamer de 'Gecombineerde A-brief materieelprojecten' (Kamerstuk [27 830, nr. 463](#)) ontvangen. Met deze Kamerbrief heeft Defensie uw Kamer eerder in het verwervingsproces geïnformeerd over de behoeftestelling van zeventien materieelprojecten. Het combineren van meerdere A-brieven stelt Defensie in staat om prioriteiten te stellen in het voorzien-in proces, doordat meer ruimte en flexibiliteit ontstaat voor de uitwerking van de behoefte (het 'hoe').

Defensie heeft in 2025 gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot clustering van DMP-brieven, waarmee interne processen kunnen worden versneld. Zo heeft uw Kamer het afgelopen jaar de A/D-brief 'Combat Counter-UAS' (Kamerstuk [27 830, nr. 458](#)), de B/D-brief 'Verwerving Maritime Strike' (Kamerstuk [27 830, nr. 467](#)) en de A/B-brief 'Verwerving infanteriegevechtsvoertuig CV90' (Kamerstuk [27 830, nr. 476](#)) ontvangen. Naast het verminderen van de administratieve lastendruk zorgt deze versnelde procesgang er mede voor dat Defensie tijdig gebruik kan maken van nieuwe kansen, bijvoorbeeld op het vlak van internationale vraagbundeling

of bij het openen van productieslots. Materieelsamenwerking met onze Europese en andere internationale partners wordt steeds belangrijker. Zo heeft Defensie in 2025 het contract getekend met Duitsland als *lead nation* voor de gezamenlijke verwerving van de Leopard-2A8 gevechtstank. In de komende jaren zal maatwerk in het DMP belangrijk blijven. Defensie blijft werken aan het verder stroomlijnen van haar interne processen, met behoud van de informatiepositie van uw Kamer.

Investeringsen

In 2025 heeft Defensie verder geïnvesteerd in nieuw en extra materieel. De urgentie om sneller over de benodigde middelen te beschikken wordt breed gevoeld in de organisatie. Op diverse vlakken vinden nu versnellingen plaats en ondanks de krapte op de markt zijn de verplichtingen aanzienlijk toegenomen. Door deze ontwikkelingen is het gelukt om diverse plannen om te zetten in bestellingen en uitbreidingen, en te voorzien in urgente behoeftes, zoals in additionele C-UAS capaciteit (Kamerstuk [27 830, nr. 474](#)).

Daarnaast is de gevechtskracht verder versterkt door te investeren in diverse essentiële capaciteiten zoals de CV90, maritieme onbemenste systemen en NH90-helikopters. Ook is geïnvesteerd in het verhogen van diverse inzetvoorraden, zoals reservedelen, kleding en uitrusting, en voorraden voor de verdediging tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) strijdmiddelen.

Naast investeringsprojecten zijn in 2025 diverse stappen gezet om de organisatie zo in te richten dat deze gebruik kan maken van nieuwe of aanvullende capaciteiten. Het betrof hierbij onder andere de maatregelen 'Versterken Grondgebonden Lucht- en Raketverdediging', 'Robuust maken jachtvliegsquadrons', 'Programma Data Science & AI' en «Inrichting Heavy Infantry Battalion». Daarnaast wordt het budget uit de Voorjaarsnota 2025 ingezet voor diverse versterkingen om aan onze NAVO-verplichtingen te kunnen voldoen, zoals het CV90 bataljon (Medium Infantry Battalion).

Nieuwe materieelprojecten en mijlpalen

Met het beschikbare budget heeft Defensie het afgelopen jaar geïnvesteerd in de versterking en vernieuwing van haar operationele capaciteit. In 2025 is Defensie 23 nieuwe projecten gestart met een financiële omvang van meer dan € 50 miljoen. Voorbeelden hiervan zijn de behoeften uit de 'Gecombineerde A-brief materieelprojecten' (Kamerstuk [27 830, nr. 463](#)), de verwerving van gespecialiseerde infrastructuur voor de Koninklijke Luchtmacht (Kamerstuk [27 830 nr. 459](#)), en de kinetische afweer van onbemenste luchtsystemen voor de Koninklijke Marine (Kamerstuk [27 830, nr. 473](#)). Defensie blijft investeren in munitie via het programma 'Aanvulling inzetvoorraad munitie'. Via dit programma worden stapsgewijs de munitievoorraden verhoogd (Kamerstuk [36 850-K, nr. 3](#)). Naast de aanschaf van nieuwe, geavanceerde systemen is verouderd materieel vervangen door moderne platforms die beter zijn toegerust op de hedendaagse en toekomstige dreigingen. Dit moderniseringsproces omvat onder meer nieuwe behoeftestellingen, *midlife updates* en noodzakelijke vervangingen.

Defensie heeft uw Kamer met diverse D-brieven geïnformeerd over investeringsprojecten en de keuze voor (deel)producten en bijbehorende leverancier. Na parlementaire goedkeuring heeft Defensie de contracten met de leveranciers bekrachtigd. Voorbeelden van projecten waarvoor in 2025 contracten zijn gesloten, zijn:

- Verwerving Maritime Strike;
- Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks;

- Verwerving Modulaire bewapening voor de ondersteuningsvaartuigen in het kader van het project ‘Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen (MSS)’;
- Verwerving Combat Counter-UAS;
- Verwerving van Foxtrot Militaire Transmissie Bouwblok ter vervanging van tactische communicatiemiddelen en de daaraan verbonden IT-infrastructuur;
- Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB).

Daarnaast is Defensie doorggegaan met de uitvoering van een groot aantal projecten, wat resulteerde in diverse nieuwe leveringen voor de krijgsmacht. Voorbeelden hiervan zijn twee nieuwe *MultiShip Multi Type Helikopter* simulatoren voor de Apache AH64E en de Groundmaster 400a radar als tijdelijke vervanging in het kader van het project ‘Vervanging Medium Power Radars’. Ook heeft Defensie de Zr.Ms Den Helder in dienst gesteld in het kader van het project ‘Verwerving Combat Support Ship (CSS)’.

Daarnaast zijn leveringen ontvangen van projecten die al langer lopen, zoals de AH64E-helikopters (Apache), de Multi Missie Radar (MMR) van Thales NL, en de containers uit het programma ‘Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)’.

Tegelijkertijd heeft Defensie ook te maken met latere leveringen, in de meeste gevallen als gevolg van de toenemende wereldwijde vraag binnen de defensiemarkt en de daarmee gepaard gaande langere levertijden. In het geval van het project ‘Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT)’ werd de vertraging veroorzaakt door een verlengd kwalificatietraject. Voor het project ‘Modernisering Tactische Indoor Simulator’ zorgde de complexiteit van het ontwerp voor de simulator voor een langere doorlooptijd.

Internationale samenwerking en interoperabiliteit

Voor de ontwikkeling van militair vermogen is het essentieel dat de krijgsmacht van Nederland en onze bondgenoten goed met elkaar kunnen samenwerken en dat wapensystemen interoperabel of zelfs uitwisselbaar zijn. Daarom streeft Defensie naar minder nationale specifieke eisen en meer aansluiting op standaardisatie binnen de NAVO en EU. Bij voorkeur kiest Defensie voor Nederlandse of Europese leveranciers, waarbij steeds met onze partners wordt gekeken naar de mogelijkheden van vraagbundeling en benutting van elkaars contracten om sneller over materieel te beschikken, zekerheid te bieden aan de industrie, en versnippering te voorkomen.

Defensie bouwt voort op de succesvolle bilaterale materiële samenwerking met België en Duitsland en binnen samenwerkingsverbanden van meerdere landen, zoals voor de vervanging van AWACS-radarvliegtuigen, en gebruikersgroepen voor de NASAMS luchtverdedigingsystemen (met Noorwegen, Finland, Litouwen, Spanje en Hongarije) en de Multi Missie Radar (met Noorwegen, Denemarken en Litouwen).

Defensie werkt in toenemende mate samen met partners in de verwerving van nieuw materieel. Zo heeft Nederland gebruikgemaakt van het Duitse vraagbundelingsinitiatief voor de levering van het Boxer RCT30 wapensysteem. Defensie verwerft het kanonsysteem Skyranger30, waarvoor een groeiende gebruikersgroep bestaat met Duitsland, Denemarken en Oostenrijk. Dit bevordert de interoperabiliteit door gezamenlijke opleiding

en training, reservedelenvoorziening en uitwisselbaarheid van munitie. Voorts schaft Nederland samen met Oostenrijk en Zweden dertien C-390 militaire transportvliegtuigen aan bij de Braziliaanse fabrikant Embraer, met Nederland als 'lead nation'.

Vastgoed en Ruimte

Vastgoed en ruimte zijn randvoorwaarden voor militaire paraatheid en de groei van de krijgsmacht. Defensie heeft meer ruimte nodig voor het vastgoed, maar ook voor het trainen en oefenen van eenheden. In het Beleidsverslag over de begroting (X) wordt toegelicht welke stappen zijn gezet voor het verhogen van de realisatie van het vastgoed.

Over de fysieke ruimte alsook de milieuruimte die Defensie nodig heeft, ontving uw Kamer het ontwerp voor het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) (Kamerstuk [36 592, nr. 17](#)) en aan het einde van het jaar is het definitieve NPRD gestuurd (Kamerstuk [36 592, nr. 55](#)). Hierin zijn de definitieve locaties aangewezen voor de ruimtelijke uitbreiding van Defensie. Omdat voor een negental defensiebehoeftes nog nader onderzoek is gedaan na het uitbrengen van het ontwerp-NPRD heeft het kabinet hiervoor alleen nog ontwerp-voorkeursalternatieven aangewezen. Definitieve besluitvorming hierover vindt, na participatie, in de eerste helft van 2026 plaats.

Voor het flexibeler en sneller gereedstellen van de krijgsmacht is in 2025 een belangrijke stap gezet door de goedkeuring door de ministerraad van het wetsvoorstel Wet op de defensiegereedheid (Wodg) en waarna deze voor advies naar de Raad van State is gestuurd. De huidige wetgeving is ingericht op vreedstijd en houdt onvoldoende rekening met de gewijzigde veiligheidssituatie. De Wodg moet Defensie in staat stellen activiteiten uit te voeren, die op grond van huidige wet- en regelgeving te veel tijd kosten of te veel belemmeringen met zich meebrengen. Hierdoor kan Defensie sneller en beter bijvoorbeeld op eigen terreinen loopgraven aanleggen, schietoefeningen doen (ook in de nacht) en trainen met drones.

Over de voortgang op de vastgoedopgave van Defensie inclusief concrete projecten en ruimtelijke ontwikkelingen wordt uw Kamer uitgebreider geïnformeerd via de Stand van Defensie en via verzamelbrieven.

Digitalisering

Defensie blijft investeren in IT, data, AI, cyber en het elektromagnetisch spectrum (EMS) om klaar te zijn voor het conflict van de toekomst (Kamerstuk [36 592, nr. 23](#)). De strategie koppelt deze ambitie aan concrete speerpunten en programma's die de digitale transformatie en de ondersteuning van een hoogwaardige krijgsmacht moeten realiseren:

- In 2025 heeft het programma GrIT twee releases opgeleverd. Release 3 heeft essentiële componenten opgeleverd voor de beproeving van de Modules Ontplooid, zoals de benodigde accreditatie, oplevering van het Protected Core Network plateau 3 en de eerste basis dienstverlening vanuit de nieuwe Twin Datacenters. De resultaten van release 4 vielen tegen door technische complexiteit in de integratie van hardware, GrIT-functionaliteit en bestaande Defensie-bouwblokken. Voor de Modules Ontplooid zijn acht typen boxen in voldoende hoeveelheden geassembleerd voor beproevingen in 2026;
- In 2025 heeft het programma Foxtrot raamovereenkomsten getekend met L3Harris voor de levering van radio's en met Thales voor de levering van IT-infrastructuur in de wapensystemen. De eerste levering militaire

- radio's is inmiddels ontvangen. Daarnaast zijn grote stappen gemaakt met de verwerving van de andere componenten die samen de totale IT-oplossing voor het mobiele en uitgestegen domein vormen;
- Het programma Roger migreert processen op het gebied van financiën, inkoop, logistiek, onderhoud, voorraad- en warehouse-beheer, analytics, transportmanagement en Defense & Security naar SAP S/4HANA. Dit raakt circa 17.000 defensiemedewerkers. De focus van het programma Roger ligt op de continuïteit en verdergaande integratie van de bedrijfscontinuïteit, integratie en een verbeterde ondersteuning van Hoofdtak 1. De migratie wordt naar verwachting medio 2026 afgerond;
 - Naast een verdere professionalisering van de *Modelling & Simulation* (M&S) organisatie is invulling gegeven aan de *Operational Training Infrastructure* (OTI) (Kamerstuk [27 830, nr. 459](#)). Ook worden, tegelijkertijd met de materieelprojecten, simulatoren aangeschaft;
 - Het programma 'Defensie Open op Orde' (DOO) heeft in 2025 bij elk Defensieonderdeel en een aantal subonderdelen een actieplan ter verbetering van de informatiehuishouding opgeleverd. Deze zijn in uitvoering. DOO blijft voor de loop van het programma de organisatie steunen met kennis, capaciteit en technologie;
 - Het documentmanagementsysteem DefDoc is in 2025 volledig in gebruik genomen binnen het kerndepartement waarbij extra aandacht is geweest voor de gebruikersadoptie en de business transformatie. De planning voor de defensiebrede uitrol is op basis van geleerde lessen aangescherpt.

Kennis en Innovatie

In 2025 bouwde Defensie voort op de in gang gezette richting uit 2024 met een meer nadrukkelijke strategische focus op de vijf prioritaire NLD technologiegebieden (quantum, sensoren, intelligente systemen, ruimtetechnologie en slimme materialen) en de maritieme sector, conform de Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie 2025-2029 (D-SII). Om het D-SII beleid tot uitvoering te brengen zijn vanuit het DMF de volgende instrumenten opgezet en/of ingezet: technologie-ontwikkelingsprojecten, het SecFund, kort-cyclische innovatieprojecten en de regionale ecosystemen via Orchestrating Defence Innovation (ODIN). Deze instrumenten worden samen met kennis-, overheids- en industriepartners vormgegeven. Voorbeelden van de voortgang op een aantal projecten en trajecten zijn als volgt:

- Een initieel Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) project leverde binnen een jaar een werkend detectie- en neutralisatiesysteem, waardoor de operationele respons tegen ongewenste drones ongeveer 30% sneller kon worden ingezet. De samenwerking met de zeven regioteams en ODIN versnelde de prototype-fase en zorgde voor een eerste gezamenlijke test-site bij het Koninklijke Landmacht;
- De doorontwikkeling van de Boxer-missiemodule demonstreerde de meerwaarde van glasvezelversterkte composieten: het gewicht van de missiemodule werd met 12% gereduceerd zonder prestatieverlies;
- Het 'Wireless Optical Alliance' project leverde een prototype lasercommunicatiesysteem met een verhoogde bandbreedte dan de eerdere radiofrequentie-oplossing, en toont de synergie tussen ruimtevaart- en intelligente systeemexpertise;
- Het hyperspectrale satellietproject heeft een operationeel demonstratiescenario opgeleverd: *realtime* objectclassificatie is mogelijk met een nauwkeurigheid van meer dan 85% voor terrein- en materieelherkenning. Dit is direct bruikbaar voor operationele inlichtingeneenheden;
- Er zijn in 2025 vijf prototype projecten gestart, waarvan twee al zijn geïmplementeerd in de ondersteuning van de F-35;

- Via het SecFund is inmiddels geïnvesteerd in vijf bedrijven voor € 1 miljoen. Het totale geïnvesteerde bedrag ligt hoger omdat er co-investeringen plaatsvinden;
- In 2025 heeft Defensie besloten haar inzet op het Rijksbrede Missiegedreven Innovatiebeleid (MIB) voor de komende jaren te intensiveren. Verder heeft Defensie haar focus in het huidige MIB verschoven naar de vijf prioritaire NLD gebieden. Daarnaast investeert Defensie in het verbeteren van het financieringslandschap voor de defensie-industrie via de Thematische Technologie Transfer (TTT).

De bovengenoemde resultaten onderstrepen hoe innovaties - gekoppeld aan sterke regionale partners en de strategische inzet van kennispartners - de technologische zelfstandigheid van de krijgsmacht vergroten en een robuuste basis leggen voor toekomstige, meer grootschalige implementatie.

Overprogrammering

In- en externe onzekerheden zoals (tijdelijk) beperkte plan-, project- en inkoopcapaciteit, krapte op de defensiemarkten, prijsstijgingen en uitlopende onderhandelingen met 2e en 3e partijen kunnen ervoor zorgen dat Defensie haar projecten later realiseert dan eerder werd geraamd. Om te voorkomen dat dit leidt tot onderrealisatie worden in de eerste jaren van het DMF meer investeringen gepland dan budget beschikbaar is en zodoende de gereedheid van Defensie te verhogen en het beschikbare budget in de betreffende begrotingsjaren maximaal te realiseren.

Defensie heeft zoals in eerdere jaren ook in 2025 een maximale overprogrammering van 30% in het uitvoeringsjaar gevoerd om de eerder genoemde onzekerheden op te kunnen vangen in de begroting en tot tijdige en volledige realisatie van het investeringsprogramma te komen. Daarnaast mag Defensie in 2026 en 2027 tijdelijk 40% overprogrammering hanteren om de groei van het defensiebudget bij te kunnen houden en de eerder genoemde risico's op vertragingen op te vangen. Dit stelt Defensie in staat het beschikbare budget volledig te besteden.

Begin 2025 werden de uitgaven op het DMF geraamd op € 9,8 miljard. De realisatie bedraagt € 10,2 miljard. Dit is een groei ten opzichte van de realisatie van € 7,6 miljard in 2024. Daarnaast zijn meer verplichtingen aangegaan, wat zichtbaar is in de verplichtingenstand. In 2024 ging Defensie € 17,8 miljard aan verplichtingen aan op het DMF, dit is in 2025 gegroeid naar € 19,1 miljard.

Ondanks de verhoging van de defensiebudgetten door veel bondgenoten en de zeer krappe defensiematerieelmarkten en arbeidsmarkt is het Defensie ook in 2025 gelukt om de snelle budgettaire groei in korte tijd om te zetten in doeltreffende bestedingen. Dit toont niet alleen de ambitie van Defensie, maar ook het aanpassings- en groeivermogen van de organisatie.

Steun aan Oekraïne

De militaire steun aan Oekraïne bestaat voornamelijk uit de donatie van militair materieel. Dit materieel valt weer uiteen in twee categorieën: materieel uit eigen voorraad en commercieel verworven materieel. Waar de steun in 2022 met name de leveringen van eigen voorraad betrof, is de levering van commercieel verworven materieel vanaf 2023 fors toegenomen. De financiële waarde van commercieel verworven materieel is inmiddels groter dan de geleverde eigen voorraad. De commerciële

verwerving wordt begroot op de Defensiebegroting (HX), op artikel 1 Inzet. De verantwoording vindt plaats in het Jaarverslag Ministerie van Defensie (X) 2025, met name in paragraaf 3.6.

Vergoeding geleverd materieel uit eigen voorraad

Het geleverde materieel uit eigen voorraad is nauwkeurig bijgehouden, zowel de boekwaarde als de vervangingswaarde zijn bekend van alle leveringen. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van de geldende marktinformatie van dat moment, net als het met de vervanging samenhangende kas- en verplichtingenritme. De middelen ten behoeve van vervanging van uit eigen voorraad geleverd materieel zijn begroot op het DMF, afgezien van een paar zeer kleine en specifieke posten die via de Defensiebegroting lopen, omdat de vervanging verloopt via de reguliere inkoopprocessen.

Tot en met 2025 is het volgende ritme begroot in het DMF:

Tabel 2 Budgettair overzicht Oekraïne				
In miljarden euro's	2022	2023	2024	2025
Defensiematerieelbegrotingsfonds	0	0	0,1	0,7
DMF, gemiste verkoopopbrengsten	0	0	0	0,1
Totaal	0	0	0,1	0,7

Zicht op de vervanging

Met de middelen die zijn begroot op het DMF is Defensie in staat om nu/op termijn het geleverde materieel aan Oekraïne te vervangen. Deze vervanging komt ten goede aan de Nederlandse Krijgsmacht, die het oorspronkelijke materieel heeft gedoneerd. Dat betekent dat de uiteindelijke waarde van de vervanging en/of het daadwerkelijke kas- en verplichtingenritme kunnen afwijken van de oorspronkelijke bepaling.

Dit betekent ook dat de vervanging daarmee onderdeel wordt van de reguliere inkoopprocessen. Dit betekent dat de verwerking en verantwoording zich kan vermengen met de reguliere defensie-investeringen binnen de processen van het DMF. In dat geval wordt de Oekraïne raming als gerealiseerd gezien.

Voor 2025 geldt dat voor € 659 miljoen aan uit eigen voorraad geleverd materieel is vervangen dan wel als gerealiseerd wordt gezien. Vanwege administratieve redenen geldt dat €68 miljoen hiervan pas in 2026 daadwerkelijk tot besteding komt, omdat de vervanging niet in 2025 heeft plaatsgevonden. De gemiste verkoopopbrengsten omvatten voor €87 miljoen schenking of realisaties van materieel uit eigen voorraad.

3.2 Onderuitputting

Bij het jaarverslag van 2023 besteedden departementen, op verzoek van de Tweede Kamer, aandacht aan resultaatbereik in relatie tot onderuitputting. Vanwege de politieke actualiteit moet het onderwerp nu verplicht worden opgenomen in het beleidsverslag.

Tabel 3 Grootste posten met onderuitputting in 2025

Bedragen in miljoenen euro	Bedrag in miljoenen euro	Als percentage van de vastgestelde ontwerpbegroting 2025 (met 1 decimaal achter de komma)
Industriesteun	- 270	- 2,5%
Overige meevallers (en tegenvallers)	- 38,3	- 0,4%
Totaal	- 308,3	- 2,9%

In 2025 is met de vergelijking stand ontwerpbegroting ten opzichte van de eindrealisatie sprake van € 308,3 miljoen onderuitputting.

De onderuitputting van € 270 miljoen heeft als reden dat de industriesteun die begroot was geen doorgang heeft gevonden. Hierdoor heeft EZ het bedrag weer teruggestort op het DMF.

De overige € 38,3 miljoen heeft als grootste reden dat er faseringen hebben plaatsgevonden in tijd van lopende contractleveringen.

4. Beleidsartikelen

4.1 Artikel 1 Defensiebreed materieel

A. Algemene doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven van Defensiebreed materieel en het instandhouden van overwegend Defensiebreed materieel uitgevoerd door COMMIT. Dit betreft materieel dat door alle operationele commando's wordt ingezet en niet specifiek gericht is op maritiem, land- of luchtoptreden. Verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. Daarnaast vallen de bekostiging van kennis en innovatie, reserve valutaschommelingen voor al het Defensiematerieel en over-/ onderprogrammering en ontvangsten van Defensiebreed materieel onder artikel 1. Kennis en innovatie is onderverdeeld in Duurzaamheid, klimaat en veiligheid, Kennisopbouw, Technologieontwikkeling, Kennisgebruik, Kort cyclische innovatie.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf van Defensiebreed materieel, de instandhouding van Defensiematerieel en afstoting van overtollig Defensiematerieel. Ook is de Minister verantwoordelijk voor de bekostiging van kennis en innovatie van Defensie

C. Beleidsconclusies

Defensie investeert in het programma 'Aanvulling inzetvoorraad munitie' in de stapsgewijze groei van de voorraden munitie. Waar mogelijk maakt Defensie gebruik van verschillende maatregelen om tijdig over het materieel te kunnen beschikken, waaronder het ophogen van lopende bestellingen via langlopende raamcontracten en samenwerking met andere landen, bijvoorbeeld door middel van vraagbundeling of verwerving via de NATO *Support and Procurement Agency (NSPA)*. Als gevolg van het aanvullende budget uit de Voorjaarsnota 2024, de Defensienota 2024 en de Miljoenennota 2025 heeft Defensie de aanvulling van de inzetvoorraden *Battle Decisive Munitions (BDM)*, non-BDM en *Deep Precision Strike* munitie in 2025 in opdracht gegeven

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Realisatie				Vastgestelde begroting		Verschil
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
	Verplichtingen	514.874	1.208.183	1.247.949	1.542.809	1.971.424	1.923.860	47.564
	Uitgaven	721.264	868.388	853.331	1.081.593	961.148	1.942.348	- 981.200
1.11	Verwerving	401.921	445.072	416.211	438.956	511.437	1.223.691	- 712.254
	<i>Opdrachten</i>	<i>401.921</i>	<i>445.072</i>	<i>416.211</i>	<i>438.956</i>	<i>511.437</i>	<i>1.223.691</i>	<i>- 712.254</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	0	226.762	- 226.762
	Verwerving: realisatie	401.921	445.072	416.211	438.956	511.437	996.929	- 485.492
1.12	Instandhouding	268.103	268.563	429.569	552.431	609.960	549.958	60.002

	Realisatie					Vastgestelde begroting	Vershil
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
<i>Opdrachten</i>	268.103	268.563	429.569	552.431	609.960	549.958	60.002
Instandhouding Materieel	268.103	268.563	429.569	552.431	609.960	549.958	60.002
1.13 Kennis en Innovatie	38.015	33.994	47.284	68.887	110.549	190.687	- 80.138
<i>Opdrachten</i>	0	0	0	0	110.549	0	110.549
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid	0	0	0	0	139	0	139
Kennisopbouw	0	0	0	0	15.665	0	15.665
Technologieontwikkeling	0	0	0	0	33.708	0	33.708
Kennisgebruik	0	0	0	0	3.834	0	3.834
Kort Cyclische Innovatie	0	0	0	0	57.203	0	57.203
<i>Bekostiging</i>	38.015	33.994	47.284	68.887	0	190.687	- 190.687
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid	0	0	0	0	0	18.565	- 18.565
Kennisopbouw	0	0	0	0	0	43.962	- 43.962
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten	4.450	3.700	8.449	8.249	0	0	0
Technologieontwikkeling	29.090	27.964	35.357	44.648	0	37.837	- 37.837
Kennisgebruik	2.393	1.159	1.050	554	0	4.380	- 4.380
Kort Cyclische Innovatie	2.082	1.171	2.428	15.436	0	85.943	- 85.943
1.14 Reserve Valutaschommelingen	13.225	120.759	- 39.733	21.319	- 270.798	0	- 270.798
<i>Storting/onttrekking begrotingsreserve</i>	13.225	120.759	- 39.733	21.319	- 270.798	0	- 270.798
Storting/onttrekking begrotingsreserve	13.225	120.759	- 39.733	21.319	- 270.798	0	- 270.798
1.16 Over-/ onderprogrammering	0	0	0	0	0	- 21.988	21.988
<i>Fonds</i>	0	0	0	0	0	- 21.988	21.988
Fonds	0	0	0	0	0	- 21.988	21.988
Ontvangsten	51.471	71.178	100.023	60.174	121.316	27.310	94.006

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 1.971,4 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dat is € 428,6 miljoen meer dan in 2024. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is € 47,6 miljoen meer verplicht dan begroot. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere verplichtingen voor de instandhouding (€ 610,0 miljoen) doordat munitieafroepen voor meerdere jaren vooruit worden geplaatst bij de industrie, om daarmee de langere levertijden op te vangen. Daarnaast is er meer kleding en uitrusting besteld om de komende jaren invulling te geven aan de groei van Defensie. Daartegenover staat het doorschuiven van de projecten in voorbereiding en afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting in de realisatiefase (per saldo € 235,0 miljoen) en lagere verplichtingen vanwege de gunstige wisselkoers van de dollar, waarvoor een valutakoerscorrectie heeft plaatsgevonden (€ 270,8 miljoen). Het restant hangt samen met de lagere uitgaven voor Kennis en Innovatie..

Uitgaven

Verwerving Defensiebreed materieel

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 1 Defensiebreed materieel € 511,4 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 72,5 miljoen ten opzichte van 2024. Desondanks is de realisatie € 712,3 miljoen lager dan

begroot, omdat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten. Daarnaast wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht.

De toegenomen wereldwijde vraag op de defensiemarkt leidt tot langere levertijden en latere (deel)leveringen voor verschillende munitiesoorten. Een aantal uitgaven voor het programma 'Aanvulling inzetvoorraad munitie' (commercieel vertrouwelijk) zijn daarom verschoven naar latere jaren.

Het programma 'Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)' (commercieel vertrouwelijk) bestaat uit verschillende deelprojecten. Een aantal geplande uitgaven voor de DVOW-deelprojecten «Container en - Subsystemen», 'Voertuig 12kN Manticore & RCWS' en 'Voertuig 12kN Air Assault (Airborne Vehicles)' vinden op een later moment plaats doordat de verificatiefase langer doorloopt en door de beperkte beschikbaarheid van een aantal onderdelen..

In 2025 is de uitrusting uit het project 'Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)' gedeeltelijk geleverd. De leveringen en de betalingen lopen daarom door in 2026.

De productievoorbereiding van het project 'Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS)' heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk voorzien. De serieproductie is eind 2025 gestart. De betalingen lopen langer door.

Voor het deelproject 'Aanhangwagens en opleggers' van het programma Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) (commercieel vertrouwelijk) hebben de contractonderhandelingen langer geduurd dan initieel voorzien. De geplande uitgaven vinden daardoor op een later moment plaats.

Voor het project 'Initiële Counter-Unmanned Aerial Systems' (commercieel vertrouwelijk) zijn een aantal (deel)leveringen vertraagd als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen van de leverancier. De verwachting is dat de systemen in 2026 alsnog worden geleverd.

Daarnaast hebben zich enkele afwijkingen voorgedaan in de overige DMP-plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 3

	projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2026	Gerealiseerd 2025	Verskil realisatie - verwachting
Defensiebreed materieel In realisatie					
Aanvulling inzetvoorraad munitie	>2500			Vertrouwelijk	
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)	77,8	31,7	15,6	6,5	-9,1
Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS)	250-1000			Commercieel vertrouwelijk	
Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)	676,0	40,1	42,1	3,3	-38,8
Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)	1000-2500			Commercieel vertrouwelijk	
Doortruwkeeling Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nuclear (CBRN)	250-1000			Commercieel vertrouwelijk	
Gespecialiseerde opslag en transportcontainers	12,9	34,5	-	5,5	5,5
Initiele Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS)	250-1000			Commercieel vertrouwelijk	
Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare eenheden van de krijgsmacht	50-250			Vertrouwelijk	
Precision Guided Rockets (PGR)	50-250			Vertrouwelijk	
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)	770,2	279,4	53,2	37,6	-15,6
Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB)	1000-2500			Commercieel vertrouwelijk	
Verwerving extended All Arms Air Defence (eAAMD) Toolbox	250-1000			Commercieel vertrouwelijk	
Verwerving helderheidsversterkende brillen	50-250			Commercieel vertrouwelijk	
Verwerving onbemanste systemen	50-250			Commercieel vertrouwelijk	

Instandhouding defensiebreed materieel

Ten opzichte van de vastgestelde begroting is defensiebreed voor € 60,0 miljoen meer uitgegeven. De uitgaven van COMMIT voor instandhouding materieel zijn € 56,4 miljoen hoger. Het betreft het saldo van € 98,6 miljoen hogere uitgaven voor kleding en uitrusting en € 51,6 miljoen lagere uitgaven door vertraagde munitieleveringen. Daarnaast is sprake van € 9,4 miljoen aan diverse kleinere verschillen bij de ondersteuning van wapensysteemmanagement. Tot slot zijn er diverse uitgaven bij de andere DO'n voor in totaal € 3,6 miljoen.

Kennis en innovatie

Het instrument bekostiging is op onderdelen vervangen met het instrument opdrachten met als doel een meer juiste verantwoording. Dit betekent dat in de tabel de mutaties gesaldeerd moeten worden gezien. Deze aanpassing is een technische wijziging.

Duurzaamheid, Klimaat en Veiligheid

In 2025 zijn de uitgaven € 18,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit budget is in verband met de uitvoering van specifieke duurzaamheidsprojecten en bestaande plannen doorgeschoven naar latere jaren zodat het aansluit bij de verwachte kasuitgaven.

Kennisopbouw

Kennisopbouw binnen het DMF betreft wetenschappelijk onderzoek, kennisgebruik- en toepassing en technologieontwikkeling, uitgevoerd door Nederlandse en internationale kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en denktanks. In 2025 zijn de uitgaven voor kennisopbouw € 28,3 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Daarvan is € 17,0 miljoen niet gerealiseerd, doordat de contractering van goedgekeurde projecten vertraging heeft opgelopen. Naar verwachting wordt deze achterstand in 2026 deels ingelopen, zodat de beoogde beleidsdoelen behaald worden. De resterende € 11,2 miljoen wordt verklaard door een budgetoverheveling naar artikel 9 in de defensiebegroting als bijdrage aan de kennisinstellingen TNO, NLR en MARIN (via het ministerie van Economische Zaken (EZ)) voor programmafinanciering van kennis & innovatie (K&I).

Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO)

De CODEMO-regeling (Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling) is een instrument dat bedoeld is voor innovatieve defensie-specifieke productontwikkeling door met name het nationale MKB. Projectvoorstellen kunnen

worden ingediend door Nederlandse bedrijven. Defensie neemt, van goedgekeurde projectvoorstellen, maximaal 50 procent van de ontwikkelingskosten voor haar rekening. Eventuele opbrengsten voor Defensie, in de vorm van royalty's over de verkoop van de ontwikkelde producten, vloeien terug naar de CODEMO-regeling. Ook zijn vanuit de oude CODEMA-regeling, de voorloper van de CODEMO-regeling, royalty's toegevoegd aan het budget van € 10 miljoen waar in 2011 mee is gestart, resulterend in een totaal budget van € 11,8 miljoen. In totaal is sinds de start van de regeling voor een bedrag van € 11,8 miljoen aan projectvoorstellen goedgekeurd en uitgegeven. In 2025 zijn geen nieuwe projectvoorstellen ingediend. In 2025 zijn er 6 projecten formeel afgerond. In navolgende tabel staan de cumulatieve cijfers vanaf het begin van de regeling.

Tabel 5 CODEMO

Ingediende voorstellen	94
Gehonoreerde voorstellen	29
Afgewezen voorstellen	65
Afgeronde voorstellen	29

Kort-cyclische innovatie

Onder kort-cyclische innovatie vallen uitgaven voor het uitvoeren van innovatieprojecten variërend van het ontwikkelen van een demonstrator tot aan marktintroductie (TRL 6-9). Bijzondere focus ligt er op het betrekken van Nederlandse industrie langs de weg van de NLD-gebieden. De projectvoorstellen komen vanuit de Defensieorganisatie en worden ook uitgevoerd door de innovatiecentra bij de Defensieonderdelen. In 2025 is geïnvesteerd in het versterken van deze uitvoeringscapaciteit, zodat meer projecten gelijktijdig kunnen worden opgestart en begeleid. Daarnaast wordt innovatie aangejaagd door het organiseren van innovatie-evenementen zoals Innovation In Defence (IID) en door deelname aan de NAVO Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA), waarmee Defensie samenwerking met innovatieve partners en opschaling van kansrijke toepassingen ondersteunt.

Op het budget voor kort-cyclische innovatieprojecten is in 2025 107% verplicht (€ 87,7 miljoen) en 61% gerealiseerd (€ 50,3 miljoen). De verhoogde verplichtingenstand hangt samen met de toename van het aantal projecten dat versneld wordt opgestart en met de sturing op het verhogen van de realisatie. De toename in verplichtingen en realisatie ten opzichte van 2024 wordt daarnaast mede verklaard door de doorwerking van eerder geplande projecten die in 2025 tot contractering en uitvoering zijn gekomen, passend bij de verdere professionalisering van het innovatiedomein.

Reserve Valutaschommelingen

De Reserve Valutaschommelingen laat jaarlijks het resultaat zien van koers verschillen op het DMF. Zowel budget als realisatie van projecten wordt tegen de CEP koers in de administratie vastgelegd en de verschillen tussen CEP koers en daadwerkelijke koers worden direct geboekt naar het detail Reserve Valutaschommelingen. De waarde van de dollar is gedurende 2025 afgenomen ten opzichte van de CEP koers wat heeft geresulteerd in een positief verschil.

Over-/onderprogrammering defensiebreed materieel

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorziene latere leveringen en omstandigheden

- kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

Ontvangsten defensiebreed materieel

De ontvangsten zijn met € 50,9 miljoen naar boven bijgesteld. Deze afwijking wordt voor het grootste gedeelte verklaard door een meerontvangst (€ 21,8 miljoen) van verkoopbrengrsten. Daarnaast is er sprake van FMS-ontvangsten (€ 10,0 miljoen) en overige ontvangsten (€ 10,7 miljoen) in verband met ontvangst van de eindafrekening over eerdere jaren van het Joint Program Office F-35. Als laatste is sprake van teruggave van ontwikkelingskosten Boxer-voertuigen (€ 5,3 miljoen).

4.2 Artikel 2 Maritiem materieel

A. Algemene doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven van het maritiem materieel en het instandhouden van materieel uitgevoerd door CZSK. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 2 (Koninklijke Marine) van de Begroting Hoofdstuk X. Ook vallen de over-/ onderprogrammering op maritieme projecten en ontvangsten onder dit artikel.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf van maritiem materieel en de instandhouding van materieel uitgevoerd door CZSK.

C. Beleidsconclusies

Defensie investeert in de grootschalige vervanging van de boven- en onder-watervloot. Met de nieuwe, toekomstbestendige vloot en moderne wapensystemen vergroot Defensie haar slagkracht op zee en voldoet daarmee beter aan haar taken en operationele plannen binnen de NAVO. In dit licht heeft Defensie de A-brieven verstuurd over de vervanging van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF), de bewapening maritieme lucht- en raketverdediging (Kamerstuk 27830, nr. 426) en de verwerving Amfibische Transportschepen (Kamerstuk 27830, nr. 327). Dit zijn projecten die op andere vlootvernieuwingstrajecten volgden waarover uw Kamer eerder werd geïnformeerd, zoals de 'Vervanging van Mijnenbestrijdingscapaciteit' (MCM), de 'Vervanging M-fregatten', de 'Verwerving Combat Support Ship' (CSS), de 'Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen', de 'Vervanging hulpvaartuigen' en de 'Vervanging van de Onderzeebootcapaciteit' (vOZBT).

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Realisatie				Vastgestelde begroting		Verschil
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
	Uitgaven	483.137	556.332	691.009	1.081.041	1.409.290	1.262.052	147.238
2.11	Verwerving	327.962	382.750	456.190	790.831	1.106.507	1.957.486	- 850.979
	<i>Opdrachten</i>	<i>327.962</i>	<i>382.750</i>	<i>456.190</i>	<i>790.831</i>	<i>1.106.507</i>	<i>1.957.486</i>	<i>- 850.979</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	0	183.505	- 183.505
	Verwerving: realisatie	327.962	382.750	456.190	790.831	1.106.507	1.773.981	- 667.474
2.12	Instandhouding	155.175	173.582	234.819	290.210	302.783	276.111	26.672
	<i>Opdrachten</i>	<i>155.175</i>	<i>173.582</i>	<i>234.819</i>	<i>290.210</i>	<i>302.783</i>	<i>276.111</i>	<i>26.672</i>
	Instandhouding Materieel	155.175	173.582	234.819	290.210	302.783	276.111	26.672
2.16	Over-/ onderprogrammering	0	0	0	0	0	- 971.545	971.545
	<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 971.545</i>	<i>971.545</i>
	Fonds	0	0	0	0	0	- 971.545	971.545

	Realisatie					Vastgestelde begroting	Verschil
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Ontvangsten	42.346	26.775	39.235	31.231	32.136	9.684	22.452

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 4.125,6 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dat is 2.014,6 miljoen minder dan in 2024. Desalniettemin is ten opzichte van de ontwerpbegroting is € 2.795,3 miljoen meer verplicht dan begroot. De hogere realisatie van het verplichtingenbudget hangt samen met de onder verwerving genoemde projecten. Daarnaast zijn er ten opzichte van de ontwerpbegroting voor € 119,3 miljoen meer instandhoudingsverplichtingen aangegaan voor 2026 en latere jaren. Dit betreft onder andere de instandhoudingsprojecten, onderwaterdrones, onderhoud aan diverse Zr.Ms. Schepen en ISR Noordzee. Verder betreft het vooral kleine contracten voor herbevoorrading, uitbesteding van onderhoud en overige diensten.

Uitgaven

Verwerving maritiem materieel

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 2 Maritiem materieel € 1.106,5 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 315,6 miljoen ten opzichte van 2024. Desondanks is de realisatie € 851,0 miljoen lager dan begroot, omdat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten. Daarnaast wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht.

In 2025 heeft Defensie in de realisatiefase «Maritiem materieel» € 1.106,5 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 315,7 miljoen ten opzichte van 2024. De realisatie op «Verwerving Maritiem Materieel» is € 667,5 miljoen lager dan begroot.

De facturering en daarmee de financiële realisatie bij het programma «Vervanging onderzeebootcapaciteit» (RGP, commercieel vertrouwelijk) is langzamer op gang gekomen dan verwacht. Er is geen sprake van vertraging op het programma.

Het project 'Vervanging M-fregatten' (ASW-fregatten, commercieel vertrouwelijk) verkeert langer in de ontwerpfase dan gepland. Het gevolg hiervan is een lagere stand onderhanden werk en facturering.

De geplande factureringen voor het project 'Vervanging MK46 Lightweight Torpedo' (vertrouwelijk) konden nog niet worden uitgevoerd. Dit werd onder andere veroorzaakt door contractuele vertragingen voor additionele extra onderdelen.

De voorziene uitgaven voor het project 'ESSM Block 2 deelproject 2: (integratie' (vertrouwelijk) zijn naar latere jaren verschoven omdat het inpassen in de portofolio van de leverancier langer duurde dan ingeschat.

Het project 'Vervanging hulpvaartuigen' (commercieel vertrouwelijk) verkeert langer in de ontwerpfase dan gepland. Dit is mede het gevolg van de herziening van de verwervingsstrategie en de technische complexiteit van het scheepsontwerp.

Voor het commercieel vertrouwelijke project 'Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit' heeft een aantal deellieferingen eerder plaatsgevonden en daarmee ook de betalingen. Deze binationale verwerving wordt uitgevoerd door België, langs de lijnen van het Belgische verwervingsproces.

Daarnaast hebben zich enkele afwijkingen voorgedaan in de overige DMP-plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 4

	projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2025	Gerealiseerd 2025	Vershil realisatie - verwachting
Maritiem materieel In realisatie					
Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging	1000-2500				<i>Vertrouwelijk</i>
ESSM Block 2: Verwerving en integratie	250-1000				<i>Vertrouwelijk</i>
Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV)	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM-PV)	215,7	0,2	8,3	38,2	29,9
Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten	76,8	78,9	-	4,4	4,4
Integratie commandovoorzieningen vlootverbanden	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Langer doorvaren LCF - Elektronische oorlogsvoering	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Langer doorvaren LCF - Materiele zeewaardigheid	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Midlife Update (MLU) Oorlogspatrouillevoertuigen (OPV)	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Multifunctionele ondersteuningsvaartuigen	250-1000				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Verbetering Mk48 Torpedo	50-250				<i>Vertrouwelijk</i>
Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten	50-250				<i>Vertrouwelijk</i>
Vervanging Close-in Weapon System (vCIWS)	250-1000				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging hulpvaartuigen	250-1000				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging LC-fregatten	>2500				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging maritiem Surface-to-surface missile	50-250				<i>Vertrouwelijk</i>
Vervanging Maritieme Orbemante Systemen	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging M-fregatten (ASWF)	>2500				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging middelzwaar landingsvaartuig (LCVP)	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM)	1.180,3	393,0	189,2	230,0	40,8
Vervanging MK48 Lightweight Torpedo	250-1000				<i>Vertrouwelijk</i>
Vervanging onderzeeboten (RGP)	>2500				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Verwerving Amphibische Transportschepen	1000-2500				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>
Verwerving Combat Support Ship	482,1	381,1	42,2	39,2	-3,0
Verwerving Maritime Strike	1000-2500				<i>Vertrouwelijk</i>
Verwerving Sofikill Torpedo Defensiesysteem	50-250				<i>Commercieel vertrouwelijk</i>

Instandhouding maritiem materieel

De instandhouding van het materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die het operationeel houden van de (wapen-)systemen met zich meebrengt. Voor dit artikel worden deze uitgaven vooral door de Directie Materiële Instandhouding van de marine gedaan.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting is er € 26,7 miljoen meer gerealiseerd voor Instandhouding materieel. Als gevolg van personele ondervulling is er € 32 miljoen meer uitgegeven aan het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden. Voor circa € 12 miljoen zijn de uitgaven hoger voor projecten als «ISR Noordzee», «C-UxV systemen», meet- en testmiddelen,

die elders in het DMF begroot stonden. Het effect van de meerontvangsten (circa € 19 miljoen) is uitgegeven aan duurdere en extra onderhouds-uitgaven en aanvulling herbevoorradingartikelen. Daartegenover staan lagere uitgaven dan begroot. Door vertragingen in de uitvoering van onderhoudsprojecten is € 17,5 miljoen onderbested. Deze uitgaven zullen de komende jaren alsnog tot realisatie komen. Tot slot zijn de uitgaven voor beleidskader inzetvoorraden tot realisatie gekomen binnen dit artikel op «Verwerving: realisatiefase» (€ 21,6 miljoen). De overige verschillen betreffen diverse kleinere onderwerpen.

Over-/onderprogrammering maritiem materieel

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorziene latere leveringen en omstandigheden - kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

Ontvangsten maritiem materieel

Ten opzichte van de ontwerpbegroting heeft de marine € 22,5 meer ontvangen. Dit is het gevolg van meer steunverlening voor derden en hogere BTW ontvangsten. Daarnaast zijn royalty-gelden ontvangen (€ 7,0 miljoen) die voortvloeien uit het project Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM).

4.3 Artikel 3 Land materieel

A. Algemene doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven van het landmaterieel en het instandhouden van materieel uitgevoerd door CLAS. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten, zoals beschreven in beleidsartikel 3 (Koninklijke Landmacht) van de Begroting Hoofdstuk X. Ook vallen de over-/ onderprogrammering en de ontvangsten van landmaterieel onder dit artikel.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf van het landmaterieel en de instandhouding van materieel uitgevoerd door CLAS.

C. Beleidsconclusies

De NAVO vraagt Nederland om met prioriteit te investeren in zwaardere gevechtscapaciteiten voor het landoptreden. In dat kader worden de gevechtscapaciteiten van de zware infanteriebrigade (*Heavy Infantry Brigade*) uitgebreid en versterkt. Voor de zware infanteriebrigade schaft Nederland tanks aan om een volwaardig tankbataljon op te richten en werden de verplichtingen aangegaan. Tevens versterkte Defensie gevechtskracht van de infanteriebataljons van de middelzware infanteriebrigade (*Medium Infantry Brigade*). Hiervoor zijn verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van 72x pantserwielvoertuig infanterie 'Boxer Remote Controlled Turret'. Met de budgetten uit de Voorjaarsnota 2025 wordt een additioneel pantserinfanteriebataljon CV90 opgericht voor de versterking van de *Medium Infantry Brigade*. Hiervoor werd de A/B-brief (Kamerstuk [27 830, nr. 476](#)) verstuurd.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Realisatie				Vastgestelde begroting		Verschil
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
	Uitgaven	620.385	542.218	889.777	1.253.621	2.532.568	2.361.006	171.562
3.11	Verwerving	334.422	255.734	560.399	888.520	2.107.192	2.045.926	61.266
	<i>Opdrachten</i>	<i>334.422</i>	<i>255.734</i>	<i>560.399</i>	<i>888.520</i>	<i>2.107.192</i>	<i>2.045.926</i>	<i>61.266</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	0	150.425	- 150.425
	Verwerving: onderzoeksfase	0	0	0	0	0	52	- 52
	Verwerving: realisatie	334.422	255.734	560.399	888.520	2.107.192	1.895.449	211.743
3.12	Instandhouding	285.963	286.484	329.378	365.101	425.376	425.656	- 280
	<i>Opdrachten</i>	<i>285.963</i>	<i>286.484</i>	<i>329.378</i>	<i>365.101</i>	<i>425.376</i>	<i>425.656</i>	<i>- 280</i>
	Instandhouding Materieel	285.963	286.484	329.378	365.101	425.376	425.656	- 280
3.16	Over-/ onderprogrammering	0	0	0	0	0	- 110.576	110.576
	<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 110.576</i>	<i>110.576</i>
	Fonds	0	0	0	0	0	- 110.576	110.576

	Realisatie				Vastgestelde begroting		Verschil
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Ontvangsten	8.578	5.107	2.898	5.131	1.687	2.500	- 813

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 6.045,1 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dat is € 2.894,5 miljoen meer dan in 2024. Ten opzichte van de ontwerp-begroting is € 3.161,3 miljoen meer verplicht dan begroot. De hogere realisatie van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk verklaard doordat zich diverse kansen hebben voorgedaan om te versnellen. Voor onder andere de verwerving van de Leopard-2A8 gevechtstanks (mei 2025, € 1.145,5 miljoen), Boxer met toren (commercieel vertrouwelijk, oktober 2025) en het antidrone kanonsysteem S kyranger als onderdeel van het project «Verwerving Combat Counter-UAS» (commercieel vertrouwelijk, december 2025) zijn de contracten getekend en is daarmee de verplichting aangegaan.

Uitgaven

Verwerving

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 3 Land materieel € 2.107,2 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 1.218,7 miljoen ten opzichte van 2024. De realisatie is € 61,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een per saldo hogere realisatie bij een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht. Daartegenover staat dat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten

In december 2024 is het contract voor het project 'Vervanging Medium Range Air Defence and Short Range Air Defence (MRAD & SHORAD)' (commercieel vertrouwelijk) afgesloten. In 2025 heeft realisatie plaatsgevonden. Deze was ten tijde van de ontwerp-begroting niet voorzien. In oktober 2025 is het contract ondertekend (commercieel vertrouwelijk) voor de 'Boxer met toren' binnen project 'Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) productie'. De realisatie was niet voorzien in de ontwerp-begroting. Het contract voor het project 'Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks' is in mei 2025 afgesloten. De € 211,2 miljoen betreft het voorschot voor de aanschaf van de gevechtstanks. Ook deze realisatie was niet voorzien in de ontwerp-begroting.

Door een langere doorlooptijd van het contract is een deel van de betalingen van het project 'Vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank (SRAT) capaciteit' (commercieel vertrouwelijk) verschoven.

Voor het project 'Multi Missie Radar (MMR)' (commercieel vertrouwelijk) zijn de aanvullende systemen nog niet onder contract vanwege een combinatie van schaarse capaciteit en doorontwikkeling van het ontwerp. De betalingen zullen als gevolg in 2026 plaatsvinden.

Voor het project 'Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten' (vertrouwelijk) is er sprake geweest van vervroegde FMS-inbetalingen in 2024 waardoor er in 2025 minder betalingen waren als voorzien. Voor het project 'Verlenging levensduur Patriot' (commercieel vertrouwelijk) is sprake van een versnelling en vervroegde FMS-inbetaling.

De geplande betalingen voor de systemen voor het project 'Raketartillerie' (vertrouwelijk) zijn naar achteren verschoven. De serieproductie vindt later plaats omdat het uitvoeren van de testen in Nederland meer tijd kost en leveringen zijn uitgesteld.

Het project 'Midlife update (MLU) Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV90' is vertraagd (€ 61,5 miljoen) in uitlevering en acceptatie van de voertuigen door een tijdelijke productiestop vanwege tussentijdse doorontwikkeling van het ontwerp.

De productie van het project 'Midlife update (MLU) Fennek' is aangepast (€ 90,1 miljoen) door een gebrek aan productiecapaciteit en onderdelen waardoor de betaling is verschoven.

Daarnaast hebben zich enkele afwijken voorgedaan in de overige DMP-plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter een aantal project wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 5

	projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2025	Gerealiseerd 2025	Vershil realisatie - verwachting
Land materieel In realisatie					
155mm Precision Guided Munition (PGM) voor de PzH2000	50-250				Vertrouwelijk
Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten	250-1000				Vertrouwelijk
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie	>2500				Commercieel vertrouwelijk
Ground based Area Access Denial (GAAD)	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig	116,8	31,8	9,8	17,1	7,3
Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Midlife Update (MLU) Bushmaster	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Midlife Update (MLU) Fennek	564,7	71,4	133,3	43,1	-90,1
Midlife Update (MLU) voor de Pantserwuitser 2000NL (PzH2000NL)	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL	880,4	281,6	138,7	77,2	-61,5
Multi-Missie Radar (MMR)	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Raketartillerie	250-1000				Vertrouwelijk
Verlenging levensduur Patriot	>2500				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging drijvende brugslagcapaciteit	63,6	13,2	34,0	37,5	3,5
Vervanging en uitbreiding Short Range Anti-Tank (SRAT) capaciteit	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT)	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging MRAD & SHORAD	1000-2500				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging mortieren 60/81mm	49,6	11,9	52,8	10,4	-42,5
Verwerving Combat Counter-UAS	1.337,8	0,0	-	143,5	143,5
Verwerving Leopard 2A8 gevechtstanks	1.662,7	0,0	-	211,2	211,2

Over-/onderprogrammering land materieel

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorzien latere leveringen en omstandigheden

- kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolie en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

4.4 Artikel 4 Lucht materieel

A. Algemene doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven van het luchtmaterieel en het instandhouden van materieel door CLRS. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding is gerelateerd aan de beleidsdoelen en -instrumenten zoals beschreven in beleidsartikel 4 (Koninklijke Luchtmacht) van de Begroting Hoofdstuk X. Ook vallen de over-/onderprogrammering en de ontvangsten van lucht materieel onder dit artikel.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf van luchtmaterieel en het instandhouden van materieel uitgevoerd door de luchtmacht.

C. Beleidsconclusies

Op 4 juni 2025 is de 25e, en tevens laatste voortgangsrapportage programma 'Verwerving F-35' naar de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstuk [26 488, nr. 478](#)). Eind 2025 is een start gemaakt met de evaluatie van het programma, waarvoor een Plan van Aanpak brief is verstuurd. Defensie versterkt de drie F-35 squadrons met de aanschaf van vijf extra F-35 toestellen. De verwerving van deze toestellen en bijbehorende middelen gebeurt door uitbreiding van het bestaande project 'Verwerving F-35'. De daadwerkelijke aanschaf verloopt via het Joint Program Office F-35 in de VS. Tevens heeft Defensie de contracten getekend voor de drie additionele NH-90 toestellen. Hiermee versterkt Defensie haar gevechtscapaciteiten door de maatregel uit de Defensienota 2024 verder uit te voeren.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)								
Art.	Verplichtingen	Realisatie					Vastgestelde begroting	Verschil
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
	Uitgaven	1.422.777	1.423.630	1.441.497	1.945.746	2.142.253	2.154.958	- 12.705
4.11	Verwerving	1.119.950	1.154.826	1.091.678	1.441.979	1.457.217	2.154.271	- 697.054
	<i>Opdrachten</i>	<i>1.119.950</i>	<i>1.154.826</i>	<i>1.091.678</i>	<i>1.441.979</i>	<i>1.457.217</i>	<i>2.154.271</i>	<i>- 697.054</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	0	205.906	- 205.906
	Verwerving: realisatie	1.119.950	1.154.826	1.091.678	1.441.979	1.457.217	1.948.365	- 491.148
4.12	Instandhouding	302.827	268.804	349.819	503.767	685.036	555.199	129.837
	<i>Opdrachten</i>	<i>302.827</i>	<i>268.804</i>	<i>349.819</i>	<i>503.767</i>	<i>685.036</i>	<i>555.199</i>	<i>129.837</i>
	Instandhouding Materieel	302.827	268.804	349.819	503.767	685.036	555.199	129.837
4.16	Over-/onderprogrammering	0	0	0	0	0	- 554.512	554.512
	<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 554.512</i>	<i>554.512</i>
	Fonds	0	0	0	0	0	- 554.512	554.512
	Ontvangsten	7.104	11.693	5.324	10.589	12.870	12.080	790

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 2.919,9 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dat is € 1.373,9 miljoen minder dan in 2024. Desalniettemin is ten opzichte van de ontwerpbegroting € 1.253,0 miljoen meer verplicht dan begroot. De hogere realisatie van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk verklaard door meer verplichtingen in de realisatiefase (€ 757,7 miljoen) vanwege het naar voren halen van verplichtingen voor een aantal projecten, en de instandhouding. Laatstgenoemde vanwege een ophoging voor het aangaan van verschillende meerjarige verplichtingen onder het construct van FMS (€ 500,0 miljoen). Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Uitgaven

Verwerving

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 4 Lucht materieel € 1.457,2 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 15,2 miljoen ten opzichte van 2024. Desondanks is de realisatie € 697,1 miljoen lager dan begroot, omdat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten. Daarnaast wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht.

Voor het project 'Verwerving F-35' is er sprake van een lagere realisatie (€ 62,7 miljoen) als gevolg van verlate factureringen voor infrastructuur en een vertraagde deellevering van toestellen. Voor wat betreft de bewapening van de F-35 vinden de leveringen binnen het project 'F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsruket' (vertrouwelijk) voor een deel in het begin van 2026 plaats waardoor de betaling in 2025 lager uitvalt dan voorzien. Als laatste is de aanschaf van Aircraft Mission Equipment (AME) binnen het project 'Deep Strike Capaciteit Air' (vertrouwelijk) naar achteren geschoven. Dit is het gevolg van herprioriteringen binnen het Joint Program Office (JPO) F-35, dat verantwoordelijk is voor de verwerving van AME.

Voor het project 'Vervanging Medium Utility Helikopter' (H225M Caracal, commercieel vertrouwelijk) is onder andere door een uitgestelde BTW-afracht en bijstelling van het leveringsschema minder uitgegeven in 2025 dan begroot.

Voor de projecten 'Chinook Vervanging & Modernisering' (€ 99,1 miljoen) en 'Apache Remanufacture' (€ 86,1 miljoen) is tevens sprake van gewijzigde leveringsschema's waardoor het FMS-betaalschema is herzien.

Voor het project NH-90 is de verplichting aangegaan inzake de uitbreiding van de NH90 vloot met drie stuks welke was voorzien in 2026. De verplichting is reeds in 2025 aangegaan, waarbij tevens een aanbetaling is gedaan (€ 36,3 miljoen). Binnen het project 'Midlife Update NH-90' (MLU), is een totaalbedrag van € 13,3 miljoen doorgeschoven naar 2026 als gevolg van langer durende contractonderhandelingen over een deelpakket van de MLU.

In 2025 heeft reeds een betaling van (€ 19,3 miljoen) plaatsgevonden voor het project 'Vervanging tactische luchttransport capaciteit' die oorspronkelijk voor 2026 was voorzien.

Daarnaast hebben zich enkele afwijkingen voorgedaan in een aantal andere DMP-plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal project wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten.

Figuur 6

Lucht materieel In realisatie	projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2025	Gerealiseerd 2025	Vershil realisatie - verwachting
Aanpak obsolescentie Cougar-helikopters	77,8	38,2	17,4	1,6	-15,8
AH-64D zelfbescherming (ASE)	33,9	33,4	-	0,5	0,6
Anti-A2AD capaciteit F-35	250-1000		Vertrouwelijk		
Apache Remanufacture	1.171,6	521,7	224,0	137,9	-86,1
Chinook Vervanging & Modernisering	1.204,0	864,1	115,8	16,7	-99,1
Deep Strike Capaciteit Air	1000-2500		Vertrouwelijk		
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket	41,6	39,7	-	0,0	0,0
F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsraaket	250-1000		Vertrouwelijk		
F-35: Verwerving munitie boordkanon, zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers	67,0	47,2	14,8	7,7	-7,1
Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding	57,5	55,8	23,4	0,5	-22,8
Midlife Update NH90	711,8	39,1	29,4	16,1	-13,3
MQ-9 Bewapening	50-250		Vertrouwelijk		
Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren	225,7	25,1	43,9	16,2	-27,8
Network Enabled Capabilities Helikopters	50-250		Commercieel vertrouwelijk		
NH90	1.662,5	1.316,7	29,9	59,9	30,0
Opbouw Operationele Satelliet Capaciteit	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Operational Training Infrastructure	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Programma Doorontwikkeling F-35	3.486,0	113,6	39,2	102,0	62,8
Uitbreiden en versterken MQ-9 capaciteit	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Verbetering AH-64E bewapening-Joint Air to Ground Missiles (JAGM)	50-250		Vertrouwelijk		
Verbetering Zelfbeschermingsystemen Helikopters	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit	189,0	0,1	33,0	25,2	-7,8
Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen	152,8	95,2	13,5	3,9	-9,6
Vervanging Medium Utility Helicopter (Aanschaf H225M Caraca)	1000-2500		Commercieel vertrouwelijk		
Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT)	468,9	457,4	10,7	9,3	-1,4
Vervanging tactische luchttransport capaciteit	1.484,3	115,5	96,3	115,7	19,3
Verwerving F-35	6.971,7	5.460,5	557,3	494,6	-62,7
Vliegtuigafreminstallatie	71,4	48,3	10,9	4,0	-6,9

Instandhouding

Instandhouding Materieel omvat de ramingen voor de uitgaven die nodig zijn om het materieel en de operationele (wapen-)systemen in goede staat te houden en gereed te maken voor gebruik.

In 2025 is het instandhoudingsbudget met € 129,8 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting. Dit is onder andere veroorzaakt door de spiegel van de onderrealisatie van 2024 (€40 miljoen) maar ook door budget voor de instandhouding van MQ-9 toestellen, F-16 en Patriot (€72 miljoen), prijs- en valutabijstelling 2025 (€50 miljoen). Voor aankoop van SATCOM is budget overgegaan naar COMMIT als gevolg van assortimentsgewijs werken (€18 miljoen). Uiteindelijk is per saldo €13 miljoen van de 1^e suppl stand niet tot realisatie gekomen.

Over-/onderprogrammering lucht materieel

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorziene latere leveringen en omstandigheden - kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolie en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

Ontvangsten

In 2025 is € 12,5 miljoen ontvangen, hetgeen € 1,0 miljoen meer is dan in de vastgestelde begroting. Hoewel de ontvangsten van de recoupment voor de F-35 nog niet binnen zijn, is de subsidie voor LVNL dit jaar wel ontvangen. Ook is in 2025 nog een bijdrage ontvangen voor de F-35 APU testcel, deze betaling bleef in 2024 uit.

4.5 Artikel 5 Infrastructuur en vastgoed

A. Algemene Doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden van alle infrastructuur en vastgoed van Defensie. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. De instandhouding wordt daarbij ingezet om het vastgoed in de gewenste kwaliteit en staat te krijgen en behouden. Ook vallen over-/ onderprogrammering en de ontvangsten van infrastructuur en vastgoed onder dit artikel. Naast de infrastructuur en vastgoed van Defensie wordt ook NAVO-vastgoed in Nederland begroot binnen dit artikel.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en instandhouding van infrastructuur en vastgoed van Defensie en de afstoting van overtollige infrastructuur en vastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de opdrachtnemer voor het uitvoeren van de door Defensie uitgegeven opdrachten.

C. Beleidsconclusies

Voldoende en toekomstbestendig vastgoed, passend bij een moderne krijgsmacht is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de groei en de gereedstelling van de krijgsmacht. Dit in een context van toenemende geopolitieke dreiging, verouderd vastgoed en een bouwsector die onder druk staat. Sinds september 2025 is de Commandopost Vastgoed (CPV) actief waarbij Defensie samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de markt gericht regie kan voeren op de vastgoedopgave van Defensie en het kunnen doen van interventies in de vastgoedketen. De concrete doelstelling is om de productie van vastgoed substantieel te verhogen van € 700 miljoen naar € 2 miljard per jaar. De CPV is in samenwerking met de markt bedacht en ontstaan om fundamenteel anders te werken aan de vastgoedopgave die vraagt om een radicale versnelling.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van verduurzaming van het vastgoed zijn in 2025 stappen gezet in de inventarisatie van de opgave. Met dit inzicht kunnen de benodigde werkzaamheden ook de komende jaren effectief en efficiënt worden uitgevoerd om te voldoen aan de energiebesparingsplicht en de verplichting voor energielabel C voor kantoren in 2029.

Over de voortgang van de vastgoedopgave is de Kamer in 2025 geïnformeerd via de verzamelbrieven vastgoed en leefomgeving van 31 maart 2025 (Kamerstuk [36 592, nr. 13](#)) en 3 juli 2025 (Kamerstuk [36 592, nr. 24](#)).

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)

Art.	Verplichtingen	Realisatie				Vastgestelde begroting	Verschil	
		2021	2022	2023	2024	2025	2025	
		768.301	794.608	828.239	1.152.387	1.559.286	1.373.366	185.920
	Uitgaven	766.349	811.620	865.706	1.075.384	1.355.180	826.758	528.422
5.11	Verwerving	342.335	378.147	412.224	476.359	706.566	954.940	- 248.374
	<i>Opdrachten</i>	<i>342.335</i>	<i>378.147</i>	<i>412.224</i>	<i>476.359</i>	<i>706.566</i>	<i>954.940</i>	<i>- 248.374</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	0	68.093	- 68.093
	Verwerving: realisatie	342.335	378.147	412.224	476.359	706.566	886.847	- 180.281
5.12	Instandhouding	424.014	433.473	453.482	599.025	648.614	507.301	141.313
	<i>Opdrachten</i>	<i>424.014</i>	<i>433.473</i>	<i>453.482</i>	<i>599.025</i>	<i>648.614</i>	<i>507.301</i>	<i>141.313</i>
	Instandhouding Infrastructuur	424.014	433.473	453.482	599.025	648.614	507.301	141.313
5.16	Over-/ onderprogrammering	0	0	0	0	0	- 635.483	635.483
	<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 635.483</i>	<i>635.483</i>
	Fonds	0	0	0	0	0	- 635.483	635.483
	Ontvangsten	20.142	21.510	26.917	24.578	29.144	28.240	904

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 1.559,3 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dit is €406,9 miljoen meer ten aanzien van vorig jaar. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is € 185,9 miljoen meer verplicht dan begroot. Het betreft een saldo van zowel verhogingen als verlagingen van de verplichtingen. De hogere realisatie wordt onder andere verklaard door het toevoegen van verplichtingenbudget dat in 2024 niet is aangegaan en een hogere realisatie voor de huren van vastgoed, Commandantenvoorzieningen en het commercieel vertrouwelijke project Technology Center Land (TCL).

Uitgaven

Verwerving

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 5 Infrastructuur en vastgoed € 706,6 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 230,2 miljoen ten opzichte van 2024. Desondanks is de realisatie voor de verwerving € 248,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt deels verklaard doordat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten. Daarnaast wordt de lagere realisatie veroorzaakt doordat op de projecten in realisatiefase minder is uitgegeven, wat hieronder wordt toegelicht.

De uitgaven voor de projecten in realisatiefase zijn per saldo € 180,3 miljoen lager dan begroot.

Er is budget van projecten in de voorbereidingsfase doorgeschoven naar de realisatiefase. Ook is een aantal budgetten verhoogd, soms als gevolg van herschikkingen van projecten maar ook als gevolg van ontvangen prijsbijstelling. In totaal is in 2025 het budget verhoogd met € 523,4 miljoen.

Daartegenover staat dat de realisatie van een aantal projecten en ook de daarmee samenhangende budgetten zijn verschoven van 2025 naar latere jaren. Met een aantal kleine herschikkingen heeft dit geleid tot een verlaging van het uitgavenbudget met € 685,9 miljoen. Dit is gedaan om budgetten juist in de tijd te zetten en financiële ruimte te creëren voor de overprogrammering. Per saldo heeft dit geleid tot lagere uitgaven van € 180,3 miljoen in 2025. Zo is er, naast de commercieel vertrouwelijke projecten, onder andere op de projecten Aanpassing vastgoed Defensie, Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra en Verbeteren Legering defensiebreed (fase 1 en 2) minder gerealiseerd dan verwacht.

Het project Aanpassing vastgoed Defensie omvat een aantal deelprojecten die nodig zijn om voor defensiegebouwen en installaties te blijven voldoen aan nieuwe en veranderde wet- en regelgeving. Verschillende deelprojecten zijn om uiteenlopende redenen in de tijd doorgeschoven. Brandveiligheid overige gebouwen en brandmeldinstallaties maken onderdeel uit van dit project

Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra - als gevolg van de reorganisatie van militaire gezondheidszorg en de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) moet de huisvesting van ca. 21 centra worden aangepast. Voor de locaties waar geen permanent aanwezige tandheelkunde is voorzien, zullen opstelplaatsen voor de mobiele tandartspraktijk (MTP) worden gerealiseerd. Risico's als capaciteit, stikstof, energiecongestie en bouwkostenstijgingen worden steeds actueler in het programma. Deze behoefte blijkt per project van veel factoren afhankelijk en zeer onvoorspelbaar.

Verbeteren Legering defensiebreed (fase 1 en 2) - Defensie groeit hard qua materieel, slagkracht en mensen. Om extra personeel te huisvesten, is er snel meer legering nodig. Standaard vastgoed inkopen ziet Defensie als goede en snelle oplossing. In deze fases wordt de huidige legering verbouwd.

De redenen voor het achterblijven in de realisatie van genoemde drie projecten zijn divers en liggen bij het Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en de markt. In enkele gevallen betreft het externe factoren die niet of beperkt beïnvloedbaar zijn zoals stikstof, netcongestie en vergunningverlening.

In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget.

Figuur 7

	Projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2025	Gerealiseerd 2025	Vershil realisatie - verwachting
Vastgoed In realisatie					
Aanpassing vastgoed Defensie	436,9	180,1	76,2	43,6	-32,6
Bouwtechnische Verbetermaatregelen Brandveiligheid	156,3	147,5	2,1	1,3	-0,7
Hoger Onderhoud Woensdrecht	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Huisvesten Hoog Risico Beveiliging Kmar	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra	117,1	38,7	19,5	2,9	-16,6
Huisvesting MIVD Frederikkazerne (HMF)	1000-2500				Commercieel vertrouwelijk
KMar LTC fase 1, 2 en 3	63,2	59,4	-	2,0	2,0
Marinierskazerne Kamp Nieuw Milligen	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw Air Mobility Command (AMC)	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw componentenonderhoud Vliegbasis Volkel	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw JIVC Den Helder	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw Logistiek Centrum Soesterberg (LCS)	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw NH90 onderhoudsdocks met squadrongebouw	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw standaard legering	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen & Schilderen op Log Centrum Woensdrecht	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Programma Veiligheid munitiegebouwen	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Realisering kazerne regio Roosendaal	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Revitaliseren vliegbasis Woensdrecht	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Revitalisering Bernhardkazerne	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Revitalisering Johannes Postkazerne	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Technology Center Land - TCL	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Uitbreiding Afmeercapaciteit in de Nieuwe Haven in Den Helder	50-250				Commercieel vertrouwelijk
Verbeteren Legering defensiebreed (fase 1 en 2)	502,4	168,3	45,2	32,9	-12,3
Versnellen Verduurzaming Vastgoed	250-1000				Commercieel vertrouwelijk
Vervanging legering KIM	<50				Commercieel vertrouwelijk

Instandhouding

De uitgaven voor instandhouding infrastructuur zijn € 141,3 miljoen hoger dan begroot.

In 2025 is incidenteel € 93,0 miljoen budget toegekend om het te verwachten tekort te dekken. Dit budget was deels bestemd voor de commandantenvoorzieningen, oftewel het realiseren van kleinschalige vastgoedvoorzieningen of aanpassing van de bestaande infrastructuur, maar voornamelijk om het budget voor de instandhouding van het vastgoed aan te vullen, omdat het Rijksvastgoedbedrijf meer heeft kunnen realiseren dan verwacht. Daarnaast is aan het project Logistiek centrum Soesterberg aanvullend budget toegekend van € 17,4 miljoen.

Daarnaast is prijsbijstelling ontvangen (€ 15,3 miljoen). Voor nieuwe opdrachten die het DOSCO heeft ontvangen en de extra uitgaven die dit voor de instandhouding tot gevolg heeft, is het budget met € 19,0 miljoen verhoogd. Er is € 14,0 miljoen overgeheveld vanuit het budget voor eigen personeel en toegevoegd aan dit budget. Ten slotte heeft een aantal herschikkingen en faseringen geleid tot een verhoging van het budget met € 19,4 miljoen. In totaal is het budget verhoogd met € 178,1 miljoen.

Daartegenover staat dat het Rijksvastgoedbedrijf in 2024 meer heeft kunnen realiseren dan begroot. Deze extra uitgaven zijn in mindering gebracht op het budget voor 2025. Dit heeft geleid tot een verlaging van het uitgavenbudget met € 18,7 miljoen. Per saldo heeft dit geleid tot hogere uitgaven van € 141,3 miljoen in 2025.

Over-/onderprogrammering vastgoed

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorzienere latere leveringen en omstandigheden - kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het

beschikbare budget van de investeringsportfolio en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

4.6 Artikel 6 IT

A. Algemene doelstelling

Het doel van dit artikel is inzicht bieden in het verwerven en instandhouden van de IT van Defensie. De verwerving wordt nader uitgesplitst in de voorbereidings-, onderzoeks- en realisatiefase. Ook vallen over-/ onderprogrammering en de ontvangsten van IT onder dit artikel.

B. Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en instandhouding van IT materieel binnen Defensie en de afstoting van overtollig IT-materieel.

C. Beleidsconclusies

Defensie heeft een digitale transformatie ingezet om haar effectiviteit te vergroten. De grote programma's leveren hier een essentiële bijdrage aan (Kamerstuk 36 592, nr. 23). Alle programma's hebben in 2025 belangrijke resultaten geboekt. Waar nodig is er sprake van versnelling gericht op de gereedstelling in het kader van Hoofdtak 1. Hiermee wordt de gereedheid van Defensie in het digitale domein vergroot.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)							
Art.	Verplichtingen	Realisatie				Vastgestelde begroting 2025	Verschil 2025
		2021	2022	2023	2024		
*** CONCEPT ***							
Art.	Verplichtingen	906.734	1.105.595	1.019.047	1.534.005	2.580.548	1.220.974
	Uitgaven	593.070	751.622	872.600	1.168.440	1.768.753	540.451
6.11	Verwerving	277.402	371.412	424.725	579.324	817.533	- 388.554
	<i>Opdrachten</i>	<i>277.402</i>	<i>371.412</i>	<i>424.725</i>	<i>579.324</i>	<i>817.533</i>	<i>- 388.554</i>
	Verwerving: voorbereidingsfase	0	0	0	0	176.397	- 176.397
	Verwerving: realisatie	277.402	371.412	424.725	579.324	1.029.690	- 212.157
6.12	Instandhouding	315.668	380.210	447.875	589.116	951.220	407.053
	<i>Opdrachten</i>	<i>315.668</i>	<i>380.210</i>	<i>447.875</i>	<i>589.116</i>	<i>951.220</i>	<i>407.053</i>
	Instandhouding IT	315.668	380.210	447.875	589.116	951.220	407.053
6.16	Over-/ onderprogrammering	0	0	0	0	- 521.952	521.952
	<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>- 521.952</i>	<i>521.952</i>
	Fonds	0	0	0	0	- 521.952	521.952
	Ontvangsten	13.941	22.797	16.572	16.222	15.634	- 1.135

E. Toelichting op de instrumenten

Verplichtingen

In 2025 is voor een bedrag van € 2.580,5 miljoen aan verplichtingen aangegaan. Dat is € 1.046,5 miljoen meer dan in 2024. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is € 1.221,0 miljoen meer verplicht dan begroot. Het

betreft voornamelijk hogere verplichtingen in de instandhouding. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het voor een langere periode (5 in plaats van 3 jaar) aangaan van een contract voor de software licentie omtrent alle GEO(data) behoeftes van Defensie. De hogere verplichtingenrealisatie voor verwerving wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van verplichtingen uit 2024 die in dat jaar niet zijn aangegaan. Het betreft het commercieel vertrouwelijke project Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS) en het programma FOXTROT.

Uitgaven

Verwerving

In 2025 heeft Defensie op de verwerving van artikel 6 IT € 817,5 miljoen gerealiseerd. Dat is een stijging van € 238,2 miljoen ten opzichte van 2024. Desondanks is de realisatie € 388,6 miljoen lager dan begroot, omdat de ramingen van de projecten in voorbereiding geactualiseerd zijn. Deze projecten zijn afgelopen jaar nader uitgewerkt en na besluitvorming overgegaan naar een volgende fase. Hierbij is ook het kasritme geactualiseerd. Het budget blijft in latere jaren beschikbaar voor deze projecten. Daarnaast wordt de lagere realisatie veroorzaakt door een aantal grote projecten, welke hieronder worden toegelicht.

In 2025 diende meerdere mijlpalen voor het programma GrIT (RGP, commercieel vertrouwelijk) te worden opgeleverd. Diverse oorzaken hebben geleid tot vertraging waardoor voor 2025 verwachte uitgaven zijn verschoven naar latere jaren.

Voor het programma FOXTROT (commercieel vertrouwelijk) is er sprake van een versneld leverschema waardoor meer FMS-betalingen zijn gerealiseerd dan vooraf verwacht.

Daarnaast hebben zich enkele afwijkingen voorgedaan in de DMP-plichtige projecten op dit artikel. In onderstaand overzicht zijn alle projecten in realisatie met een financiële omvang van meer dan € 50,0 miljoen opgenomen. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een indicatie gegeven van de bandbreedte van het projectbudget. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Het restant van het verschil kan worden verklaard door het saldo van verschuivingen in een aantal kleinere, niet DMP-plichtige projecten

Figuur 8

IT In realisatie	projectbudget actueel	t/m 2024	Verwacht 2025	Gerealiseerd 2025	Verskil realisatie - verwachting
Geinstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden	102,5	62,3	28,8	9,3	-19,5
GrIT (RGP)	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Joint Electronic Attack (EOV)	50-250		Commercieel vertrouwelijk		
Modernisering Tactische Indoor Simulator (TACTIS)	250-1000		Commercieel vertrouwelijk		
Programma Foxtrot	>2500		Commercieel vertrouwelijk		
Realisatie Maritime Operations Centre Admiral BENELUX (MOC ABNL)	85,6	2,0	4,8	2,1	-2,8
Vervanging ESM-capaciteiten KL EOVS-systeem	50-250		Commercieel vertrouwelijk		
Vervanging grondterminals MILSATCOM	60,7	54,3	4,0	2,1	-1,9

Instandhouding

In 2025 is de realisatie (€ 951,2 miljoen) op de instandhouding van IT met € 362,1 miljoen toegenomen ten opzichte van 2024. Tevens is er voor € 407,1 miljoen meer uitgegeven aan instandhouding IT dan in de vastgestelde begroting. Deze stijging ten opzichte van de begroting wordt mede verklaard door de extra exploitatielasten van de nieuwe IT die voortkomen uit het programma GriT. De uitgaven zijn in 2025 vanuit het projectbudget beschikbaar gekomen voor de instandhouding. Daarnaast was er sprake van een transformatieprogramma om het realisatievermogen van JIVC in kader van Hoofdtak 1 te vergroten om zodoende sneller IT te kunnen leveren. Tevens zijn er maatregelen genomen om de cyber security van Defensie te verbeteren. Tenslotte is als gevolg van de personele groei van Defensie de behoefte aan IT-middelen fors hoger dan verwacht.

Over-/onderprogrammering IT

Defensie raamt in het begrotingsjaar meer investeringen dan het budget dat daarvoor beschikbaar is. Dit is de overprogrammering. Door onzekerheden - denk bijvoorbeeld aan onvoorziene latere leveringen en omstandigheden - kunnen de geraamde investeringen afwijken. Door meer investeringen te programmeren wordt zoveel als mogelijk getracht te voorkomen dat latere leveringen bij individuele projecten leiden tot onderrealisatie van het beschikbare budget van de investeringsportfolie en de gehele begroting. Overprogrammering is zodoende een instrument dat bij kan dragen aan een tijdige en doelmatige implementatie van de investeringsbudgetten. Omdat niet meer uitgegeven kan worden dan het beschikbare budget, vindt op overprogrammering geen realisatie plaats. De geraamde overprogrammering wordt gedurende het jaar afgeboekt tot nul.

4.8 Artikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het betreft uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment toegedeeld moeten worden aan de beleidsartikelen van het DMF. Een voorbeeld hiervan is de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling, die nog moet worden verdeeld over de afzonderlijke artikelen; dit budget wordt tussentijds aangehouden op dit artikel.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)							
	Realisatie				Vastgestelde begroting		Verschil
	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Art. Verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
8.18 Nader te wijzen uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
<i>Fonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fonds	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

5. Bedrijfsvoeringsparagraaf

Rechtmatigheid

Bij de verplichtingen op artikel 1 Defensiebreed materieel is voor een bedrag van € 79,1 miljoen aan onrechtmatigheden en onzekerheden geconstateerd (de meest waarschijnlijke fout). Daarmee wordt de artikeltolerantie van artikel 1 van € 98,6 miljoen niet overschreden. De maximale fout ligt met € 165,7 miljoen echter boven de tolerantiegrens van artikel 1.

Bij de verplichtingen op artikel 6 IT is voor een bedrag van € 97,2 miljoen aan onrechtmatigheden en onzekerheden geconstateerd (de meest waarschijnlijke fout). Daarmee wordt de artikeltolerantie van artikel 6 van € 129,0 miljoen niet overschreden. De maximale fout ligt met € 172,8 miljoen echter boven de tolerantiegrens van artikel 6.

Toelichting onrechtmatigheden en onzekerheden

De onrechtmatigheden en onzekerheden van de aangegane verplichtingen van het DMF betreffen met name escalatiedossiers verwerving, VTA-dossiers (Verantwoording toezicht achteraf) en geïmporteerde fouten doordat afgeroepen wordt op onrechtmatige rijksbrede overbruggingsovereenkomsten.

Door middel van de escalatieprocedure verwerving wordt expliciet vooraf afgewogen of sprake is van een onontkoombare noodzaak tot aanbesteding van een overheidsopdracht of verlenging van een overeenkomst om op basis daarvan af te wijken van de (Europese) aanbestedingsregelgeving. Voor artikelen 1 en 6 leverde dit in 2025 onrechtmatige verplichtingen op ter waarde van circa € 21,8 miljoen. Daarnaast zijn op de artikelen 1 en 6 voor € 25,0 miljoen onrechtmatige verplichtingen via de VTA procedure aangegaan.

Het Ministerie van IenW is categoriemanager op een aantal rijksbrede raamovereenkomsten. De overbruggingsovereenkomsten voor Interim Management & Organisatieadvies, en Financiële Adviesdiensten zijn als onrechtmatig beoordeeld. Het ministerie van IenW heeft dit toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf van haar jaarverslag. Als gevolg daarvan worden de verplichtingen die op deze nadere overeenkomsten onder deze overbruggingsovereenkomsten worden aangegaan als onrechtmatig bestempeld. Voor Defensie betreft het op artikel 1 circa € 1,7 miljoen.

Het Ministerie van Economische Zaken is categoriemanager voor de raamovereenkomsten op het gebied van ICT-inhuur. Deze raamovereenkomsten zijn in 2023 rechtmatig aanbesteed en gegund, maar er werken onrechtmatige verplichtingen door in 2025, omdat de inhuurovereenkomsten in 2025 nog doorliepen en gebruik is gemaakt van bestaande verlengingsopties in deze overeenkomsten. In dit verslagjaar gaat het bij Defensie op de artikelen 1 en 6 om circa € 36,4 miljoen.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid was categoriemanager voor de raamovereenkomst grafische dienstverlening. Per 1 januari 2025 is een overbruggingsovereenkomst aangegaan om de periode tussen de afgelopen raamovereenkomst en de nieuw aan te besteden raamovereenkomst te overbruggen. In dit verslagjaar gaat het om circa € 1,2 miljoen op artikel 6. De nieuwe raamovereenkomst zal vallen binnen de Categorie Logistiek van het Ministerie van Financiën.

Tabel 12 Overzicht overschrijdingen rapporteringstoleranties fouten en onzekerheden (bedragen x 1000)

(1) Rapporteringstolerantie	(2) Verantwoordteringsbedrag in € (omvangsbasis)	(3) Rapporteringstolerantie op basis van fouten en onzekerheden in €	(4) Bedrag aan fouten in €	(5) Bedrag aan onzekerheden in €	(6) Bedrag aan fouten en onzekerheden in €	(7) Percentage aan fouten en onzekerheden t.o.v. verantwoord bedrag = (6)/(2)*100%
Totaalniveau artikelen verplichtingen	19.201.838	384.037	257.521	36.311	293.832	*
Artikel 1 Defensiebreed Materieel	1.971.424	98.571	79.112	-	79.112	*
Artikel 6 IT	2.580.548	129.027	60.920	36.311	97.231	*

*Doordat bij de controle gebruik is gemaakt van steekproeven is de maximale fout groter dan de tolerantie. Omdat het bedrag aan fouten en onzekerheden onder de tolerantie ligt, wordt conform het voorschrift in de RBV geen percentage opgenomen.

C. JAARREKENING

6. Verantwoordingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds

Tabel 13 Verantwoordingsstaat 2025 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (Bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving	Vastgestelde begroting (1)			Realisatie (2)			Verschil (3) = (2) - (1)		
	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
1 Defensiebreed Materieel	1.923.860	1.942.348	27.310	1.971.424	961.148	121.316	47.564	- 981.200	94.006
2 Maritiem Materieel	1.330.211	1.262.052	9.684	4.125.553	1.409.290	32.136	2.795.342	147.238	22.452
3 Land Materieel	2.883.755	2.361.006	2.500	6.045.100	2.532.568	1.687	3.161.345	171.562	- 813
4 Lucht Materieel	1.666.905	2.154.958	12.080	2.919.927	2.142.253	12.870	1.253.022	- 12.705	790
5 Infrastructuur en Vastgoed	1.373.366	826.758	28.240	1.559.286	1.355.180	29.144	185.920	528.422	904
6 IT	1.359.574	1.228.302	16.769	2.580.548	1.768.753	15.634	1.220.974	540.451	- 1.135
8 Overige Uitgaven en Ontvangsten	71	71	0	0	0	0	- 71	- 71	0
Subtotaal	10.537.742	9.775.495	96.583	19.201.838	10.169.192	212.787	8.664.096	393.697	116.204
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar		0	0		0	0		0	0
Subtotaal	10.537.742	9.775.495	96.583	19.201.838	10.169.192	212.787	8.664.096	393.697	116.204
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar		0	9.678.912		0	9.956.405		0	277.493
Totaal	10.537.742	9.775.495	9.775.495	19.201.838	10.169.192	10.169.192	8.664.096	393.697	393.697

In het jaarverslag 2024 is vermeld dat het voordelig eindsaldo DMF € 4.029,9 miljoen betrof. Dit saldo dient nog gecorrigeerd te worden met de kasschuiven ter waarde van € 3,65 miljard en overige begrotingsmutaties ten bate van de begroting ter waarde van € 0,15 miljard die gedurende 2024 hebben plaatsgevonden. Voor inzicht in deze kasschuiven en overige begrotingsmutaties wordt verwezen naar de verticale toelichting in het Financieel Jaarverslag van het Rijk (bijlage bij het Financieel Jaarverslag, hoofdstuk 9, sectie Defensiematerieelbegrotingsfonds). Defensie sloot 2024 daarom af met een voordelig eindsaldo van € 502.100. Begrotingsjaar 2025 werd afgesloten met een voordeling eindsaldo van € 308.287.

7. Saldibalans

Tabel 14 Saldibalans per 31 december 2025 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) (bedragen x € 1.000)

Activa	31-12-2025	31-12-2024	Passiva	31-12-2025	31-12-2024
Intra-Comptabele Posten					
1. Uitgaven ten laste van de begroting	10.169.192	7.605.821	2. Ontvangsten ten gunste van de begroting	212.787	147.925
1a. Nadelig Saldo vorig boekjaar	0	0	2a. Voordelig Saldo vorig boekjaar	0	695.530
3. Liquide Middelen		0			0
4. Rekening Courant RHB	0	0	4a. Rekening Courant RHB	9.956.405	6.762.366
5. Rekening Courant RHB Begrotingsreserve			5a. Begrotingsreserve		0
6. Vorderingen buiten begrotingsverband			7. Schulden buiten begrotingsverband		0
8. Kas-Transverschillen		0			0
Subtotaal Intra-comptabel	10.169.192	7.605.821		10.169.192	7.605.821
Extra-Comptabele posten	0	0		0	0
			9a. Tegenrekening Openstaande Rechten	0	0
9. Openstaande Rechten	0	0			
			10a. Tegenrekening Vorderingen	39.778	35.924
10. Vorderingen	39.778	35.924			
11a. Tegenrekening Schulden	0	0	11. Schulden	0	0
			12a. Tegenrekening Voorschotten	6.430.315	3.897.214
12. Voorschotten	6.430.315	3.897.214			
13a. Tegenrekening garantieverplichtingen	0	0	13. Garantieverplichtingen	0	0
14a. Tegenrekening andere verplichtingen	35.413.666	26.381.018	14. Andere Verplichtingen	35.413.666	26.381.018
			15a. Tegenrekening Deelnemingen	0	0
15. Deelnemingen	0	0			
Subtotaal Extra-comptabel	41.883.760	30.314.156		41.883.760	3.0314.156
Overall Totaal	52.052.951	37.919.978		52.052.951	37.919.978

Door afrondingen kan het totaal afwijken van de som van de onderdelen. In 2025 worden de meeste balansposten tegen de koers van de laatste werkdag voor jaareinde 2025 verantwoord. Uitgezonderd zijn een aantal voorschotten en verplichtingen waarvoor de CEP-koers (Centraal Economisch Plan) van februari 2025 is gebruikt en posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

Intra-comptabele posten

ad 1 en 2 Uitgaven ten laste en – ontvangsten ten gunste van de begroting

Onder de posten uitgaven en ontvangsten zijn de per saldo gerealiseerde uitgaven en – ontvangsten opgenomen. De bedragen komen overeen met de bedragen uit de verantwoordingsstaat. Door een andere afrondings-systematiek is er een verschil met de verantwoordingsstaat waar per artikel naar boven wordt afgerond.

ad 3 Liquide middelen

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 4 en 4a Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft per saldo de financiële verhouding met de Rijkshoofdboekhouding weer. Het bedrag is per 31 december 2025 in overeenstemming met de opgave van de Rijkshoofdboekhouding.

ad 6 Vorderingen buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 7 Schulden buiten begrotingsverband

Het saldo op de saldibalans is nihil.

Extra-comptabele posten

ad 9 Openstaande rechten

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 10 Vorderingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 39,8 miljoen.

Tabel 15 Verdeling vordering naar aard (bedragen x € 1.000)

Baten-lastendiensten Defensie	0
Verkoop overtollige goederen	12.178
Buitenlandse mogendheden	473
Diversen	27.128
Saldo vorderingen 31-12-2025	39.778

Als criterium voor de toelichting van vorderingen geldt een grensbedrag van € 10,0 miljoen.

Er zijn geen vorderingen boven de € 10,0 miljoen.

De verdeling van de vorderingen naar opeisbaarheid is hieronder in een tabel weergegeven.

Tabel 16 Opeisbaarheid van vorderingen (bedragen x € 1.000)

Direct opeisbaar	11.845
Op termijn opeisbaar	27.933
Geconditioneerd	0
Totaal	39.778

ad 11 Schulden

Het saldo op de saldibalans is nihil.

ad 12 Voorschotten

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 6.430,3 miljoen.

Alle voorschotten van voor 2008 staan tegen de maandkoers van december 2007 gewaardeerd en de voorschotten vanaf 2008 zijn gewaardeerd tegen de op het moment van verstrekking geldende maandkoers of de CEP-koers van het betreffende jaar van verstrekking. Uitgezonderd zijn de posten die met valutatermijncontracten zijn afgedekt, deze zijn opgenomen tegen de betreffende valutatermijnkoers.

De verdeling van de voorschotten naar ouderdom is vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 17 Ouderdom voorschotten (bedragen x € 1.000)

Jaar van ontstaan	Beginstand per 01-01-2025	Nieuwe voorschotten	Afgerekende voorschotten per 31-12-2025	Eindstand per 31-12-2025
<2021	949.620		144.225	805.395
2022	289.801		55.548	234.253
2023	701.470		148.002	553.468
2024	1.956.323		316.405	1.639.918
2025	0	3.226.535	29.254	3.197.281
Totaal	3.897.214	3.226.535	693.434	6.430.315

De toename van het openstaand voorschotbedrag kan worden verklaard door de sterk stijgende defensiebudgetten. Daarnaast werden het afgelopen jaar veel contracten met de defensie-industrie gesloten.

Als criterium voor de toelichting van voorschotten geldt een grensbedrag van € 100,0 miljoen.

Foreign Military Sales

Binnen het FMS programma wordt niet voorgefinancierd door de Amerikaanse overheid waardoor het voorschot bij een afgesloten FMS case in eerste instantie oploopt. Binnen FMS cases blijven voorschotten langer openstaan doordat de administratieve verwerking van de leveringen aan Amerikaanse zijde vaak achterloopt op de fysieke leveringen. Het totale openstaande saldo aan voorschotten gerelateerd aan FMS cases die het grensbedrag passeren per 31-12-2025 is € 564,4 miljoen.

Daarnaast heeft Defensie een aantal omvangrijke voorschotten boven het grensbedrag uitstaan voor verschillende projecten. Deze zijn hieronder genoemd. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Op artikel 2 Maritiem materieel betreft het een voorschot van € 214,6 miljoen voor het project Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM).

Op artikel 3 Land materieel betreft het een voorschot voor het project Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL (€ 123,3 miljoen) en een voorschot voor het project Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks (€ 211,2 miljoen).

Op artikel 4 Lucht materieel betreft het de volgende projecten: Vervanging tactische luchttransport capaciteit (€ 155,2 miljoen) en Programma Doorontwikkeling F-35 (€ 171,9 miljoen) en Apache Remanufacture (€ 274,7 miljoen).

Gelet op het (commercieel) vertrouwelijke karakter een aantal projecten met een voorschot boven het grensbedrag, zijn deze projecten niet in bovenstaande lijst opgenomen.

ad 14 Andere verplichtingen

Het saldo op de saldibalans bedraagt € 35.413,7 miljoen.

Bij de nieuw aangegane verplichtingen is uitgegaan van de methode van het opnemen in de rekening van zowel de positieve als negatieve bijstellingen van oude verplichtingen.

Tabel 18 Verplichtingen (bedragen x € 1.000)

Andere verplichtingen 01/01/2025	26.381.018
Aangegane andere verplichtingen in verslagjaar	19.201.839
Waarvan Negatieve Bijstelling	0
Subtotaal	45.582.857
Tot betaling gekomen in verslagjaar	10.169.192
Openstaande andere verplichtingen per 31/12/2025	35.413.666

In 2025 is er geen sprake van negatieve bijstellingen met een financiële omvang van € 25,0 miljoen of hoger. Derhalve staan de negatieve bijstellingen in de verloopstaat op nul.

Er staan op 31 december 2025 verplichtingen open groter dan € 100,0 miljoen.

Foreign Military Sales

Bij het FMS programma wordt de verplichting door Defensie direct afgesloten met de Amerikaanse overheid. FMS kent administratief een langere doorlooptijd na het aangaan van de verplichting dan een commercieel contract, waardoor verplichtingen langer openstaan. Het totale openstaande saldo aan verplichtingen gerelateerd aan FMS cases per 31-12-2025 is € 5.802,8 miljoen.

Daarnaast heeft Defensie een aantal overige openstaande verplichtingen boven het grensbedrag uitstaan voor verschillende projecten. Deze zijn hieronder genoemd. De voortgang van deze projecten wordt in het DPO toegelicht. Deze wordt gelijktijdig met dit jaarverslag aan uw Kamer aangeboden.

Op artikel 1 Defensiebreed materieel betreft het een verplichting van € 152,1 miljoen voor het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) en een verplichting van € 101,4 miljoen voor het project Operationele infrastructuur voor de snel inzetbare eenheden van de krijgsmacht. Daarnaast staat er een verplichting van € 304,8 miljoen open voor het programma WTB (Wissellaadsystemen, Trekkeropleggercombinaties Wielbergingsvoertuigen).

Tevens is er voor het project Polaris uit het Nationaal Groeifonds een verplichting aangegaan. De looptijd van het project is tot en met 2032. In 2025 zijn de eerste betalingen gedaan. Voor de desbetreffende budgetpositie internationale samenwerking, waarbinnen project Polaris valt, is er sprake van een openstaand verplichtingenbedrag van € 102,7 miljoen.

Op artikel 2 Maritiem materieel betreft het een verplichting van € 474,4 miljoen voor het project Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM) en € 152,9 miljoen voor het project Future Littoral All-Terrain Mobility Patrouillevoertuigen (FLATM-PV). Daarnaast staat er € 363,8 miljoen aan

verplichtingen open voor het project MICAN (Modular Integrated Capability for ACDF and North Sea), en € 128,9 miljoen voor het project vervanging Maritiem Surface-to-surface missile.

Er is sprake van een openstaand verplichtingenbedrag van € 125,6 miljoen voor een wet-leasecontract voor de levering van lucht verkenningcapaciteit in het Caribisch gebied met vaste vleugelvliegtuigen voor een periode van 10 jaar. Het contract is afgesloten met ISR Support Europe B.V. Het betreft de beschikbaarstelling van 2 DASH-8 toestellen, inclusief personeel en onderhoud. De geplande ingangsdatum van het contract is februari 2024 en loopt tot en met januari 2034.

Op artikel 3 Land Materieel betreft het € 934,2 miljoen voor het project Verwerving Leopard-2A8 gevechtstanks, € 397,9 miljoen voor het project Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL en € 294,0 miljoen voor het project Midlife Update (MLU) Fennek.

Daarnaast is er een openstaande verplichting van € 145,0 miljoen die de meerjarige raamovereenkomst voor het onderhoud aan de vrachtauto's van de Koninklijke Landmacht betreft (50, 100, 150 KN). De facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie.

Tevens is er een openstaande verplichting van € 106,5 miljoen voor de C wapensystemen. Dit betreffen kleine wapensystemen. Deze worden meestal verworven door de operationele commando's, met een bovengrens van € 5,0 of € 10,0 miljoen. De openstaande verplichtingen betreffen verwervingen, waarvoor in 2025 al wel een contract is ondertekend, maar waarvoor nog geen goedgekeurde leveringen en dus geen betalingen zijn voortgekomen.

Op artikel 4 Lucht Materieel staat een verplichting open van € 780,9 miljoen voor het project verwerving F-35, € 369,6 miljoen voor het project Apache remanufacture, € 101,6 miljoen voor het project Midlife-Update Chinook en € 104,0 miljoen voor het project vervanging Pilatus PC-7 Turbo Trainer. Daarnaast betreffen het ook openstaande verplichtingen van € 1.108,7 miljoen voor het project vervanging C-130 Hercules-transportvliegtuig, € 110,8 miljoen voor het project Midlife Update NH90-maritieme gevechtshelikopter, € 945,1 miljoen voor het programma doorontwikkeling F-35 en € 146,1 miljoen voor het project maritieme NH-90 helikopters.

Er staat een verplichting open van € 1.264,7 miljoen voor de aanschaf van 8 C-390 transportvliegtuigen. De levering van deze transportvliegtuigen zal gedeeltelijk plaatsvinden in 2028, 2029 en 2030.

Voor het project «Opbouwen Operationele SPACE Capaciteit» zijn in 2025 langjarige contracten afgesloten, die openstaan voor een bedrag van € 110,0 miljoen. De ontwikkeling van een ruimtetelescoop en de levertijd van satellieten duurt jaren waardoor deze in 2025 verplicht zijn met leveringen in latere jaren. Ook de lanceer-slots voor deze satellieten hebben als gevolg van beperkte capaciteit een lange doorlooptijd en zijn daarom in 2025 ingekocht.

Voor het meerjarige onderhoud van de F-35 staat een verplichting open van € 158,6 miljoen.

Er staat ook een verplichting open van € 138,4 miljoen voor de langjarige ondersteuning van de AH-64 Apache op Ft Hood, Texas, voor onderhoud, opleidingen en trainingen door het Amerikaanse leger. Omdat zowel het oplopen als het implementeren van dergelijke FMS case lang duurt, is deze verplichting in 2025 aangegaan voor de periode 2027-2031.

Voor de logistieke ondersteuning voor het onderhoud van de Apache en Chinook vloot staat een verplichting open van € 131,7 miljoen. Dit zo genoemde COHESU contract bestaat op hoofdlijnen uit een drietal onderdelen: Performance Based Logistics met volledige ontzorging voor de beschikbaarheid van onderdelen, transacties voor reparaties en Catalogus afroepen van reserveonderdelen.

Er staat een verplichting open van € 172,9 miljoen voor de termijnbetalingen voor de exploitatie van het Defensiebrede Bewakings- en BeveiligingsSysteem (DBBS), dit is voor de gehele duur tot en met 2036. Daarnaast staat er een verplichting van € 141,3 miljoen open voor het project DBBS. Het uitrollen van het systeem geschiedt in mijlpalen welke komende jaren betaalbaar zullen worden gesteld.

In oktober 2025 is gestart met de bouw van het nieuwe Technologie Centrum Land (TCL). Hiervoor is in september 2025 de bestelopdracht vastgelegd, het betreft een openstaande verplichting voor een totaalbedrag van € 195,0 miljoen met een kasgeldverdeling over de jaren 2025 t/m 2028. De nieuwe werkplaats moet in 2028 klaar zijn.

Voor de rente en aflossing van de Kromhoutkazerne staat een verplichting van € 299,9 miljoen open. Er wordt op jaarbasis ongeveer € 32,0 miljoen afgelost aan rente en aflossing.

Er loopt momenteel een project voor de verbetering van de huisvesting van de Frederikskazerne. De openstaande verplichtingen, ter waarde van € 101,9 miljoen, betreffen reeds goedgekeurde activiteiten van het Rijksvastgoedbedrijf voor dit project welke in 2026 tot realisatie gaan leiden.

Ten slotte staat er een verplichting van € 133,3 miljoen open voor het programma Foxtrot Spiral 0 voor Force Package 1.

Gelet op het (commercieel) vertrouwelijke karakter van een aantal projecten met een verplichting boven het grensbedrag, zijn deze projecten niet in bovenstaande lijst opgenomen.

D. BIJLAGEN

Bijlage 1 Lijst met afkortingen

Tabel 19 Afkortingen

Afkorting	Omschrijving
AI	Artificial Intelligence
AI&DS	Artificial Intelligence & Data Science
APOS	ActiePlan Onbemenste Systemen
ASAP	Act in Support of Ammunition Production
ASWF	Anti Submarine Warfare Frigates
AR	Algemene Rekenkamer
AWR	Afwijkingsrapportage
BITS	Brainport Innovation and Technology Security
BKI	BeleidsKader Inzetvoorraden
CEP	Centraal Economisch Plan
CIO	Chief information Officer
CIWS	Close-in Weapon system
CLAS	Commando Landstrijdkrachten
CODEMO	Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling
COMMIT	Commando Materieel en IT
CW	Comptabiliteitswet
CZSK	Commando ZeeStrijdKrachten
DBBS	Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem
DCC	Defensie Cyber Commando
DIANA	Defence Accelerator for the North Atlantic
DIS	Defensie Industrie Strategie
DMF	DefensieMaterieelbegrotingsFonds
DMP	DefensieMaterieelProces
DOKS	Defensie Operationeel Kleding Systeem
DOO	Defensie Open op Orde
DOSCO	Defensie OndersteuningsCommando
DPO	Defensie Projectenoverzicht
DVOW	Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen
EDIP	Europese Defensie-Industrie Programma
EDIRPA	European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act
EDIS	Europese Defensie-Industrie Strategie
EDTIB	Europese Defensie Technologische en Industriële Basis
ERP	Enterprise Resource Planning
EU	Europese Unie
F-16	Jachtvliegtuig
F-35	Vijfde generatie jachtvliegtuig
FMS	Foreign Military Sales
FRISC	Fast Raiding Interception and Special forces Craft
GrIT	Grensverleggende Informatie Technologie
HEDI	Hub for EU Defence Innovation
IGV	Infanterie gevechtsvoertuig
IT	InformatieTechnologie
KCT	Korps Commandotroepen
KIM	Koninklijk Instituut voor de Marine
LCU	Landing Craft Utility
LCW	Logistiek Centrum Woensdrecht
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MLU	Midlife Update
MRAD	Medium-Range Air Defense

Afkorting	Omschrijving
NAVO	Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie
NIF	NAVO Innovatiefonds
NLDTIB	Nederlandse Defensie Technologische Industriële Basis
NPRD	Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
RBV	Rijksbegrotingsvoorschriften
RVB	Rijksvastgoedbedrijf
SAR	Search and Rescue
SecFund	Security Fund
SHORAD	Short-Range Air Defense
SUP	Single Use Plastic
TR-3	Technology Refresh-3
UAS	Unmanned Aerial Systems
VMUH	Vervanging Medium Utility Helicopters
WTB	Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen
ZE	Zero Emissie
Zr. Ms.	Zijner Majesteits
